

Handleiding voor de inspectie van beton- en gemetselde kunstwerken, vallende onder het beheer van de Cowi's

Opgesteld door de sector Betonbouw: oktober 1975

Ter attentie van de gene, die de inspectie uitvoert:

- dit formulier is bedoeld als aanvulling op uw eigen technisch inzicht;
- uw inspectie betreft het gehele kunstwerk, dus ook die onderdelen, waarvan het onderhoud niet door NS wordt verzorgd;
- afhankelijk van de toestand moet "ja" of "neen" worden afgehaald;
- de kolom achter de "ja/neen"-kolom is bestemd voor het omschrijven van een gekonstateerde afwijking

aanduiding van het kunstwerk	lijncode	123	km	13.850
naam van de persoon, die de inspectie uitvoert;	van Meer			
aanduiding beheerder van het kunstwerk	Cslm Bld 4530			

onderdoor -
gans
Bakkenlaan

Uittreksel model 1635 t.b.v. gemetselde/betonnen konstrukties.

1. Beton oppervlakken	
1.1	hoe is uw algemene indruk
1.2	zijn er scheuren of kalkstrepen zichtbaar
1.3	is er schade door aanrijding of aanvaring zichtbaar
1.4	is de wapening ergens zichtbaar
1.5	is de plaats van de wapening zichtbaar door verkleuring van het oppervlak

alleen onderdoor

ja/neen

ja/neen

ja/neen

ja/neen

1.0	is oppervlak begroeid met mos of algen	ja/neen	Hykars vrietspader
2. Gemetselde konstrukties (bijv. landhoofden)			
2.1	hoe is uw algemene indruk	goed	
2.2	zijn er scheuren zichtbaar	ja/neen	
2.3	is de toestand van het voegwerk voldoende	ja/neen	
2.4	is er schade door aanrijding of aanvaring zichtbaar	ja/neen	Hele lieke beschadiging dakzijde
3. Oplegkonstrukties			
3.1	hoe is uw algemene indruk		
3.2	is er roestvorming zichtbaar	ja/neen	
3.3	maken de zijanten van de rubber- of kunststof oplegplaten een hoek van meer dan 30° met de verikaal	ja/neen	
3.4	zijn deze oplegplaten gescheurd	ja/neen	
4. Kunstwerken in het water			
4.1	is er schade tussen water en wind		ja/neen
4.2	is de toestand van de remmingwerken voldoende		ja/neen
5. Taluds			
5.1	geven de taluds voldoende steun aan het grondlichaam	ja/neen	
5.2	is de toestand van de begroeiing voldoende	ja/neen	

5.3	is de toestand van de afsluitende vloer	ja/neen
6. Regenwaterafvoer		
6.1	wordt de ballast voldoende gedraineerd	ja/neen
6.2	zijn er lekkages geconstateerd	ja/neen
6.4	is de toestand van de omliggende muren voldoende	ja/neen
6.5	functies van de met betrekking tot de afvoer van regenwater	ja/neen
6.6	is de toestand van de afvoer van regenwater voldoende	ja/neen
6.7	zijn de afvoerputten schoon	ja/neen
7. Grondwater		
7.1	zijn er vochtplekken zichtbaar, die naar uw mening het gevolg zijn van onvoldoende grondwaterkering	ja/neen
7.2	zijn er lekkages nabij de dilatatievoegen	ja/neen
8. Staalconstructies		
8.1	zijn de leuningen voldoende stevig	ja/neen
8.2	is de toestand van de montage onder de leuningslijnen voldoende	ja/neen
8.3	is er roestvorming zichtbaar nabij de bevestiging van andere staalconstructies in het beton	ja/neen
8.5	is het kunstwerk voldoende afgevoerd tegen onbevoegd betreden	ja/neen


8.7	zijn de putdeksels en/of oosters in goede staat	ja/neen
8.8	in de toestand van het schilderwerk voldoende	ja/neen
9. Vormstijfheid		
9.1	zijn er aanwijzingen dat het brugdek teveel doorbuigt	ja/neen
9.2	zijn er, bij het passeren van treinen resp. autoverkeer, abnormale schokken of trillingen te constateren	ja/neen
10. Diversen		
10.6	kunnen er ontstierende elementen worden weggenomen	ja/neen
11. Verdere inspectiepunten		
11.1		
12. Opmerkingen, van de persoon, die de inspectie heeft uitgevoerd		
: <i>alleen schoon maken</i>		
12.1	datum van inspectie	19-5-20
12.2	weersgesteldheid tijdens de inspectie	zonnig/heldere hemel koud/vochtig
12.3	aanwezigheid hulpmateriaal bij de inspectie	duimstok/ schraper/ ladder/ veeg veeg
12.4	handtekening van de persoon die de inspectie heeft uitgevoerd:	gezien, de Cdw: over de methoden, waarop het onderhoud kan worden uitgevoerd, is zondig overleg met de l.s. 3 (betonbouw) te Utr. mogelijk.

* degene die de inspectie uitvoert, vermeldt in dit vak, zijn mening over de situatie. De Cdw geeft de beslissing ja/neen.

1. HOOFDINSPECTIERAPPORT

Lijnnoed: 123 km 19,850
Onderdoorgang Statenlaan.....

60

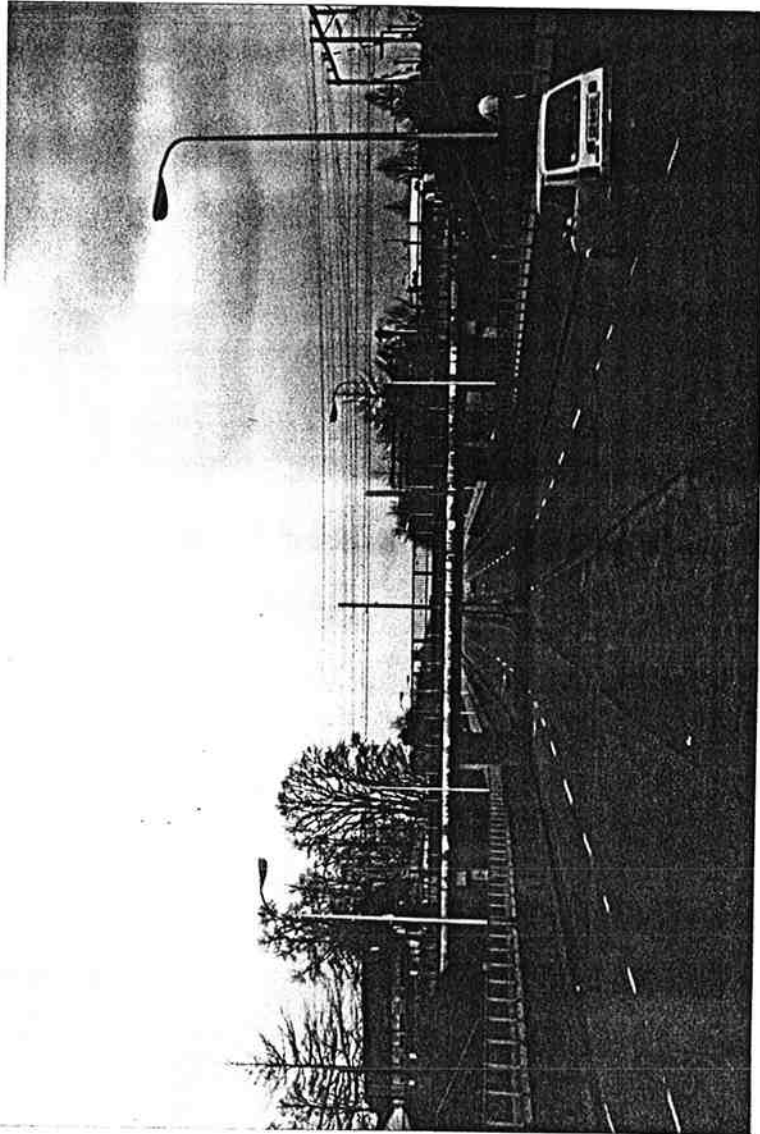

K0

2. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, enz.)

Voorgespan. betonplaat op 5 stemp.
gefund. op palen.
steeng. ballenbed - op litten P.V.C. vles.

3. Overspanningen / ~~litten~~: 7,25 - 3,10 - 3,10 - 7,25 m.

4. Totale lengte: 20,65 m

5. Type opleggingen: hoofdsp. schuifschijven

6. Bouwjaar: 1967

7. Renovatie(s) in

03

3

7

67

-

1

8. Algemene kwaliteit

1 goed

2 bruikbaar

3 ingrijpend herstel nodig

4 vernieuwing nodig

5 technisch verouderd

1

9. Draagkracht (op datum van de hoofdinspectie)

1 Volgens berekening en visuele inspectie geen bezwaar tegen belasting volgens VOSB 1963

2 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting D4 (4-assige wagens met aslasten van ten hoogste 225 km en een tonmetergewicht van ten hoogste 8.0)

3 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

4 Visuele inspectie geeft op dit moment nog geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.

5 Beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig worden nodig geoordeeld.

4

10. Gevaar voor aanrijden en aanvaren.

De draagkracht van de konstruktie kan aanzienlijk worden verminderd t.g.v.

1 aanrijden door treinen

2 aanrijden door autoverkeer

3 aanvaringen

4 Geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig.

11. Levensduur.

Nieuwbouw of herstel, ten laste van IPK, zal naar schatting nodig zijn:

1 niet binnen 40 jaar

2 niet binnen 10 jaar

3 binnen 10 jaar

4 op korte termijn



4

12. Kosten voor NS van de in punt 11 bedoelde nieuwbouw of herstel worden geschat op :

- 1 minder dan f 500.000,—
- 2 meer dan f 500.000,— maar minder dan f 2.500.000,—
- 3 meer dan f 2.500.000,—
- ④ nihil, de kosten komen ten laste van derden.

3

13. Persoonlijke veiligheid.

De afstand vanaf hart spoor tot de begrenzing van de vluchtruimte is :

- 1 kleiner dan 2,50 m; gevaarlijk !
- 2 groter of gelijk aan 2,50 m, doch kleiner dan 3,00 m.
- ③ groter dan 3,00 m.

88

14. Volgende Dienstkring inspectie in de jaren 1988, 1991, enz.

97

15. Periodieke hoofdinspectie wel niet nodig.
volgende hoofdinspectie in 1997

2

16. Overeenkomst : geregeld bij overeenkomst

17. Ontwerper :

Is 5.3

18. Aannemer :

Shukton - Hillen & Reessen

19. Opmerkingen :

- Alle langsvoegen lekken.
- langs voeg tussen spanplaten - gering
- = langs voeg tussen spanpl. - publiek pad
- steek
- Veel water overluit op landhoofden -
- afkomstig van passeerbrug -
- publieke brug
- Corrosie v.d. wapening lgv. v.a.

- geringe lekkings aan zijkant parallelbuis
- ondervolging lekken vegen aandeelt
- passeerbrug ligt vol plassen. (niet afwaterend).
- Doeg spoorbrug - passeerbrug is afgedekt met hout. (oorspr. open e.e.v.w.)
- hekstijl zijde pompminste in stuk gewonnen.
- Wand trap zijde spoor Tb. Bd. is aangesmeerd en vertoont vele haarscheuren (zie foto).

opname o/vgd A. van Leeu

* "Wand trap zijde spoor Tb. Bd is aange-smeerd en vertoont vele haarscheuren" delen worden los van ondergrond.

* HWA passeerbrug noord ketsloven de landhoofden.

* passeerbrug zuid heeft geen afvoer

Verkeersplan vervolg - 27 Maart 1985

20. Hoofdinspectie uitgevoerd d.d.

namens CdW: Cob.


W. v. Dijk


slw. HPF. v. Gompel.

namens Is 5.3 : lng. P. Maassen




Composie v.d. Wapening publiek pad.

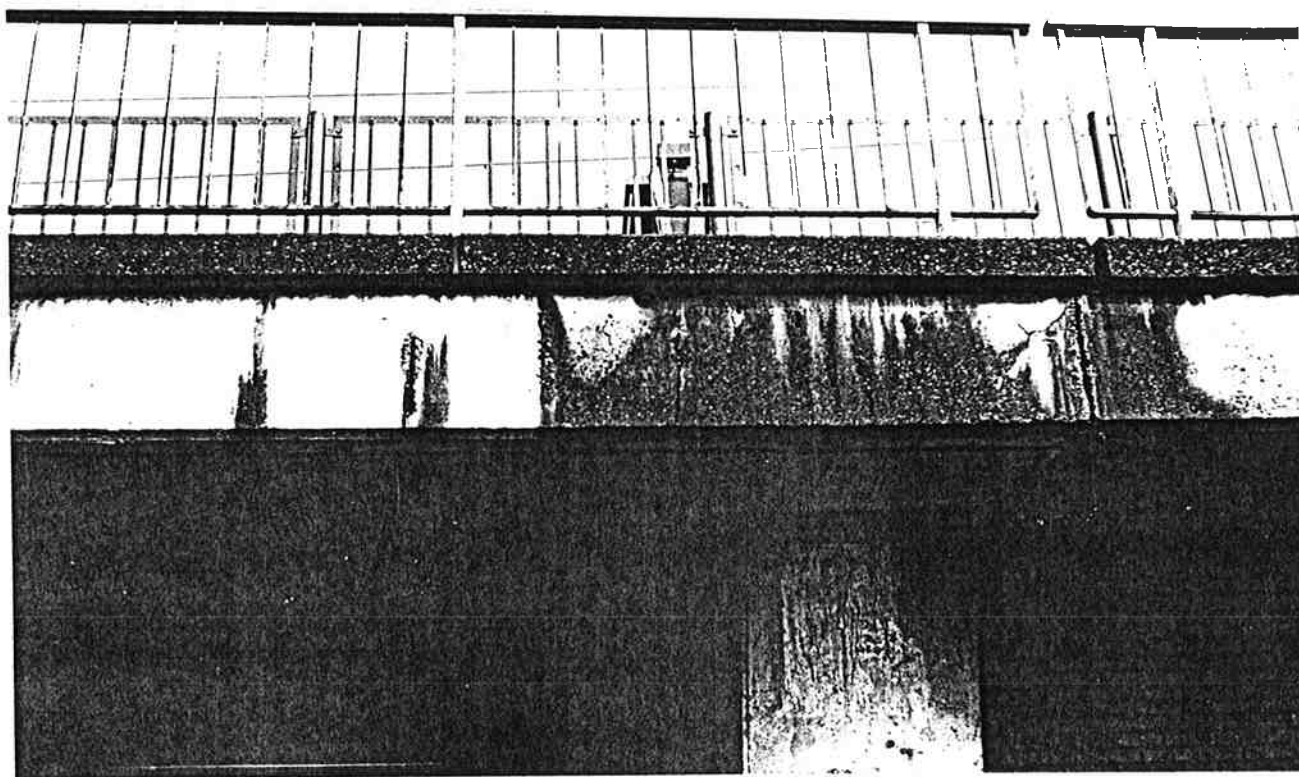

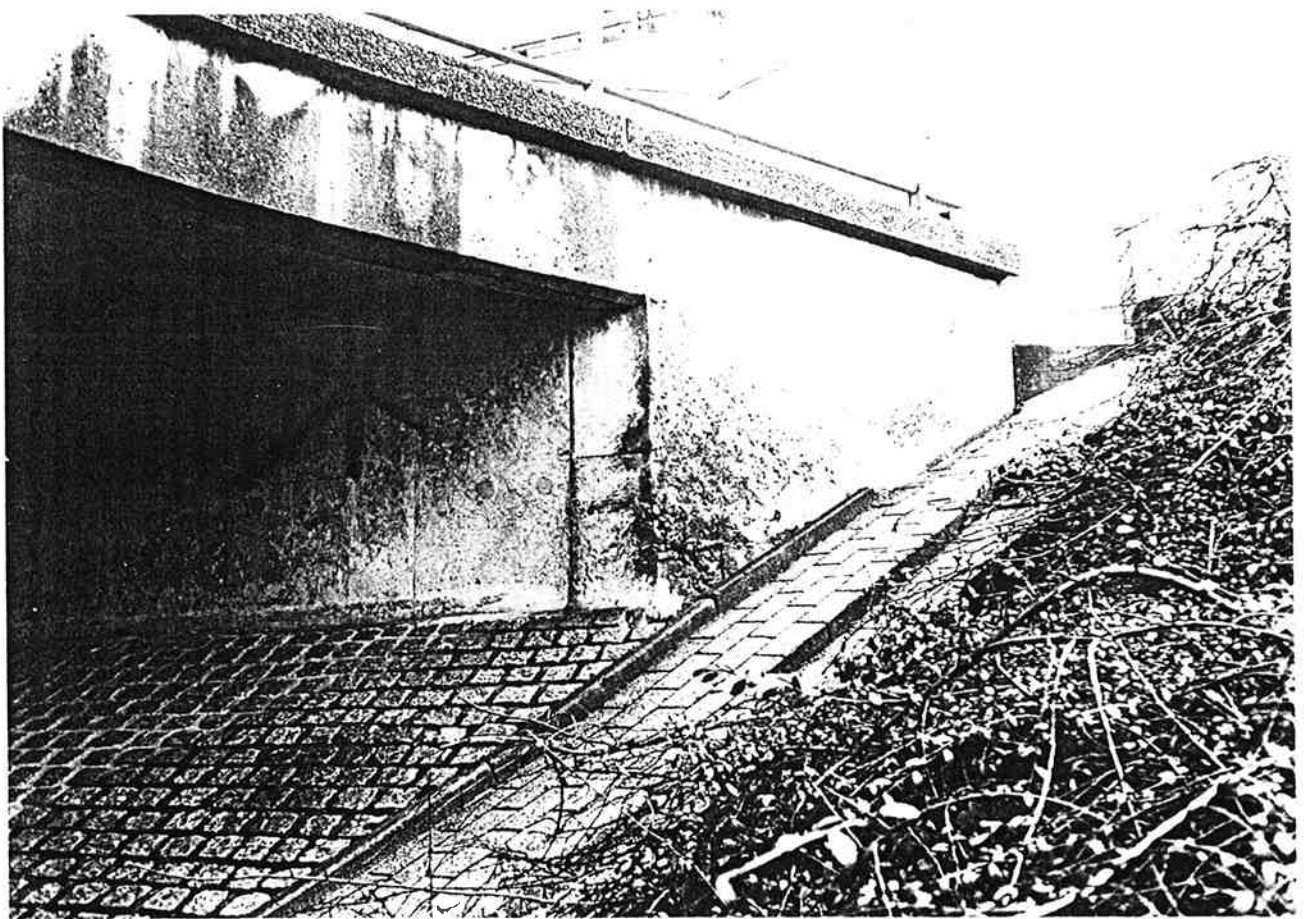

„Grindnest“ vleugel publiek pad

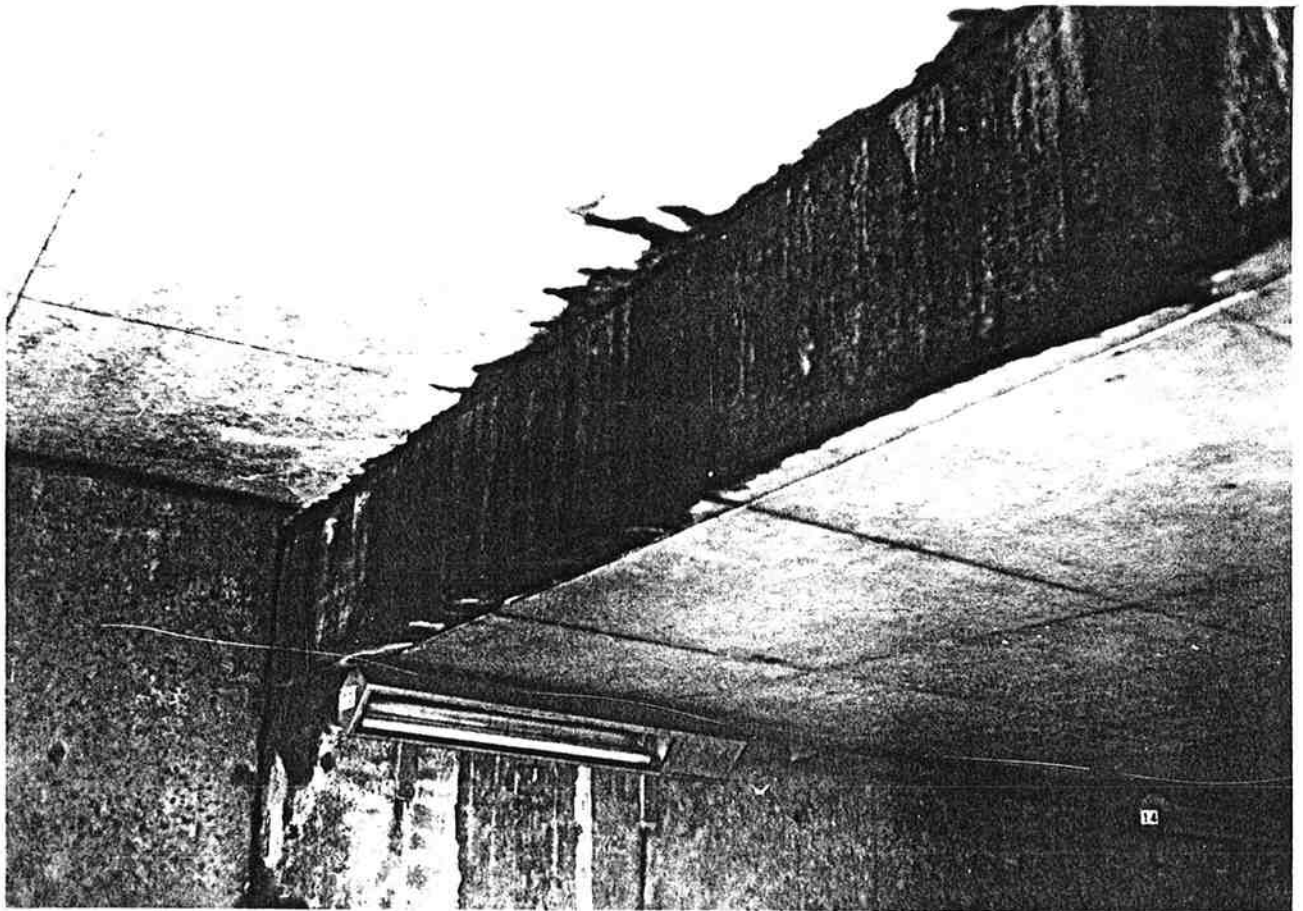

lekkende voeg publiek pad - spoorbrug



- Passenbrug langs spoor Tb. Brede
