

KWALITEITSINSPECTIE RAPPORTAGE

Uitgevoerd in opdracht van:

NS Railinfrabeheer Kunstwerken

Inhoud:

Voorblad
Schetsblad
Objectgegevens "Overzicht kunstwerk"
Objectgegevens "Overzicht kunstwerk" wijziging
Inspectiegegevens
Conclusie/aanbeveling
Fotobladen
Kwaliteits-/Meetgegevens

Kwaliteitsopname van het object:

Mark Langeweg

Lijncode: 121 km: 008.620

Regio: Zuid


Datum: november 1998



Project: 5782301

Versie: 1.0 Status: Vrijgegeven



Opname uitgevoerd door Inspectieteam: van Dijk/Post

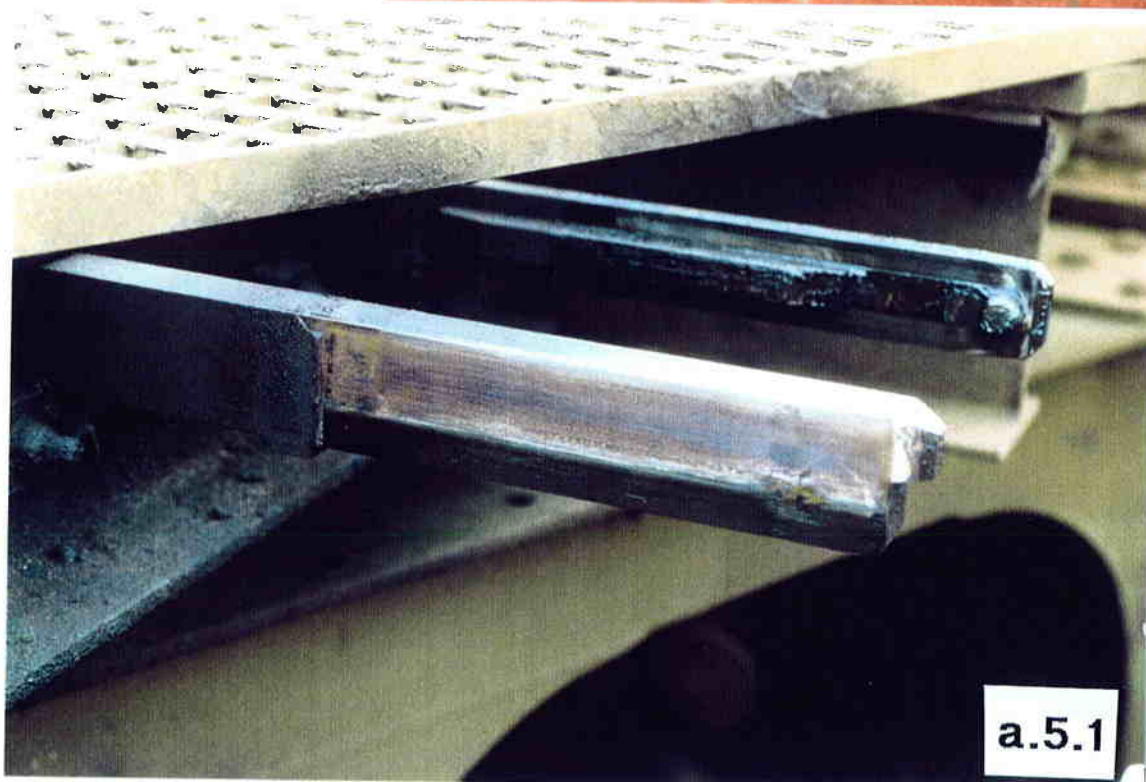

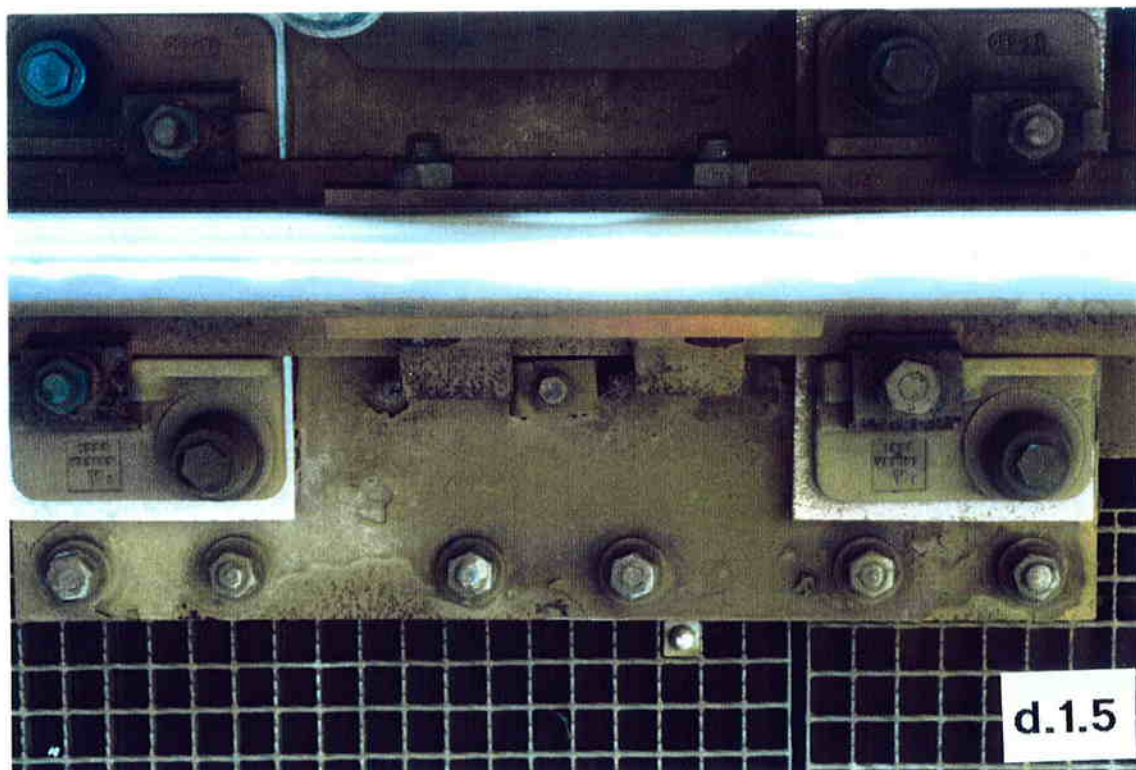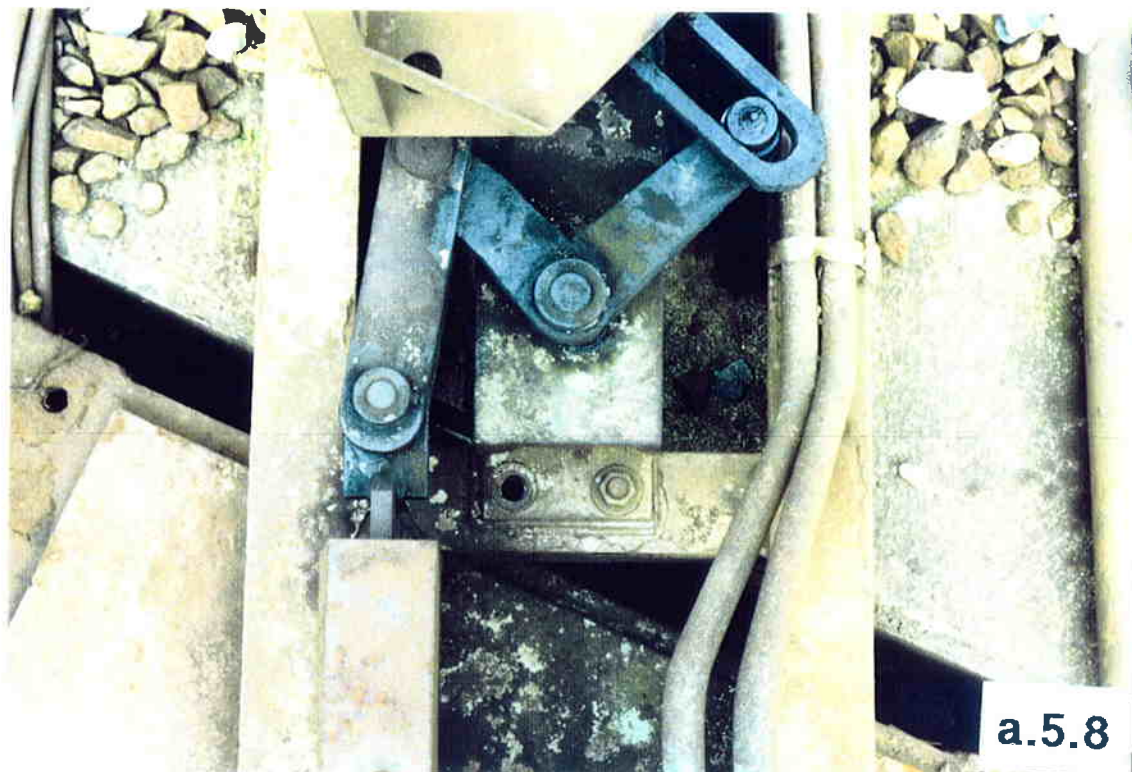



Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

A. Mechanische Controle-inrichting**1. Pompset t.b.v. de aandrijfeenheid**

A1.1	Zichtbare lekkage op unit/koppelingen	O/X	Zie opmerking
A1.2	Controle oliepeil	0	Vrij laag
A1.3	Controle werkdruk (tot 25 bar)	0	Zie opmerking
A1.4	Controle max. druk (40 bar)	X	Zie opmerking
A1.5	Controle looptijd schieters heen/terug (tot 10 sec.)	0	4 sec./ 4 sec.
A1.6	Nalooptijd (5 tot 10 sec.)	X	4 sec./ 4 sec.
A1.7	Controle filterindicatie	0	
A1.8	Vermogensmeting		Niet uitgevoerd
A1.9	Toestand stalen leidingwerk	0	

2. Aandrijfeenheid schieters en spoorstaafcontrole

A2.1	Controle smeeroliepeil		Niet uitgevoerd / zie opmerking
A2.2	Zichtbare lekkage	0	
A2.3	Inspectie rubberslangen	O/X	Zie opmerking
A2.4	Afdekplaat asvierkant gangbaar	0	
A2.5	Speling lager, asvierkant	0	
A2.6	Speling geleidingen linealen	0	
A2.7	Draaien m.b.v. handbediening	0	
A2.8	Smering rondsel/heugels	0	
A2.9	C-slot gangbaar + kleurcode	0	

Opmerkingen:

- A1.1 De onderzijde van de pompset is nat van de lekolie.
- A1.2 Werkdruk MCI terug 19 bar
MCI uit 19 bar
- A1.3 Max. druk MCI terug 42 bar
MCI uit 48 bar
- A2.1 Het oliepeilglas is door het inspectieluik niet te controleren
- A2.3 Geen inspectierapport/certificaat aangetroffen

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

A. Mechanische Controle-inrichting**3. Universele aandrijfeenheid Grendel**

A3.1	Zichtbare lekkage op unit/koppelingen	0	
A3.2	Controle oliepeil	X	Zie opmerking
A3.3	Controle werkdruk (tot 25 bar)	0	Uit: 6 bar. terug: 6 bar.
A3.4	Controle max. druk (60 bar)	0	Uit: 60 bar. terug: 60 bar.
A3.5	Controle looptijd schieters heen/terug (tot 10 sec.)	0	Heen 6 sec. terug 6 sec.
A3.6	Nalooptijd (5 tot 15 sec.)	0	Heen 5 sec. / terug 5 sec.
A3.7	Vermogensmeting		
A3.8	Toestand stalen leidingwerk	0	
A3.9	Toestand verdeelblok	0	
A3.10	C-slot gangbaar + kleurcode	X	Zie opmerking
A3.11	Handbediening	0	
A3.12	Rubber balg	0	Niet aanwezig
A3.13	Ophanging	0	

Opmerkingen:

A3.10 Het slot gaat zeer zwaar, bij het draaien tordeerd de sleutel

A3.2 Aan het peilglas is niet te zien of de aandrijfeenheid vol of leeg is.

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O	Norm = (.....)	X / O	Opmerking
---------------------	----------------	-------	-----------

A. Mechanische Controle-inrichting**4. Stangen en assen**

A4.1	Slijtage pijpen	0	
A4.2	Speling nylonleiding	0	
A4.3	Speling pennen/gaffels	0	
A4.4	Smering draaipunt MCI	0	
A4.5	Smering lagers assen diam. 65	0	
A4.6	Controleren autoflex koppelingen diam. 65	0	
A4.7	Toestand conservering	0	

Opmerkingen:

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

A. Mechanische Controle-inrichting**5. Schieters en afsluitlantaarns**

A5.1	Roestv. Eindschieters	X	Zie opmerking
A5.2	Speling nylongeleiding	0	
A5.3	Afstelling brugseinkoppeling/ brugcontactinrichting	X	Zie bladzijde 8
A5.4	Inloop brugseinkoppeling/ brugcontactinrichting	X	Zie opmerking
A5.5	Stofkleppen brugcontactinrichting	0	
A5.6	Afstelmaten hoogtecontrole	0	
A5.7	Toestand geleiding hoogtecontrole	0	
A5.8	Afsluitlantaarn speling pennen	X	Zie opmerking
A5.9	Draaipunt afsluitlantaarn	0	
A5.10	Positie rol in sleuf afsluitlantaarn (in eindstanden 10 mm tot einde sleuf)	0	

Opmerkingen:

- A5.1 De eindschieters aan de zijde Drd zijn niet gesmeerd en licht geroest.
- A5.4 Tijdens inloop zoeken de schieters ca. 3 mm aan de zijde Dordrecht.
- A5.8 De sleufgeleiding van de afsluitlantaarn is niet gesmeerd en er zijn slijtsporen zichtbaar. Een bevestigingsbout van het brugsein is niet aanwezig.

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

X / O


Opmerking

A. Mechanische Controle-inrichting**6. Spoorstaafcontrole**

A6.1	Speling nylongeleiding	0	
A6.2	Toestand ertalon plaat	0	
A6.3	Afstelmaten schieters ertalonplaten	X	
A6.4	Bevestiging aan spoorstaaf	0	
A6.5	Speling plaat in "brievenbus"	0	

Opmerkingen:**A6.3**

Bd

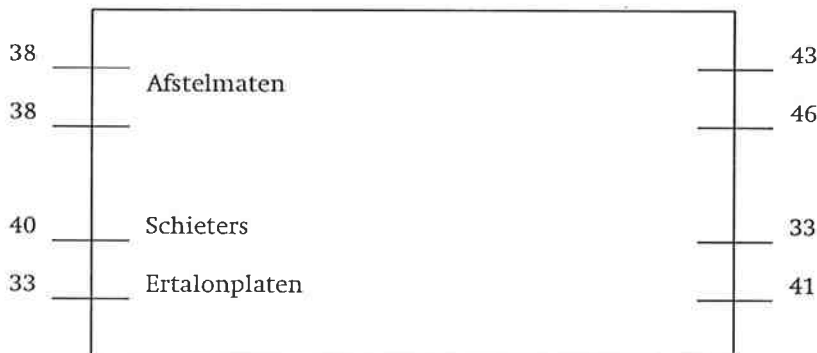

Drd

A6.3 Bij een afstand van 20 mm tussen de schieter en het brugsein, zijn de spoorstaafcontroleschieters nog niet in de ertalonplaat gecontroleerd.

De afstelmaten van de schieters tot de ertalonplaten zijn groot.

NS/Railinfrabeheer Opname d.d.:15/10/98		Ic/km: 121/8.620	
Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg			
Slecht = X Goed = O		Norm = (.....)	X / O
Opmerking			
A. Mechanische Controle-inrichting			
7. Muurgrendel en centreerpen			
Muurgrendel			
A7.1	Speling geleiding schieter muurgrendel	O/X	Zie opmerking
A7.2	Bevestiging frame muurgrendel aan val	O	
A7.3	Muurgrendel huis schoon	O	
A7.4	Positie brug voor het grendelen	X	Zie opmerking
A7.5	Centrering bij grendelen	X	Zie opmerking
A7.6	Conservering	O	
A7.7	Smering	X	Zie opmerking
Centreerpen			
A7.8	Bevestiging centreerplaat aan huis	O	
A7.9	Bevestiging centreerpen aan val	O	
A7.10	Centrering bij brug zakken	O	
A7.11	Maat onderzijde pen bovenzijde plaat bij geheven stand brug	O	70 mm
A7.12	Conservering	O	
A7.13	Inloop tijdens centreren	O	Zie opmerking
Opmerkingen:- A7.1 De muurgrendel heeft zijdelings 6 mm speling A7.4/A7.5 De positie van de brug voor het grendelen is dusdanig dat de muurgrendel bij het vergrendelen nog net niet tegen het huis botst. A7.7 Het grendel is niet gesmeerd en vervuild. A7.13 Tijdens het zakken zoekt de centreerpen ca. 20 mm.			

NS/Railinfrabeheer Opname d.d.: 15/10/98		lc/km: 121/8.620															
Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg																	
Slecht = X Goed = O	Norm = (.....)	X/O	Opmerking														
A. Mechanische Controle-inrichting																	
8. Afstand tussen kop liniaal en brugsein/contact																	
A8.1	Gemeten waarden tot brugcontact-inrichting en brugseinkoppeling en afstelmaten schieters spoorstaaf-controle	X	Zie opmerking														
Bd		Ddr															
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none; padding: 5px 10px;">75</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">—</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">brugsein</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">(brugsein - 94 mm)</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">brugsein</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">—</td> <td style="border: none; padding: 5px 10px;">70</td> </tr> <tr> <td style="border: none; padding: 5px 10px;">78</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">—</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">brugcontact</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">(brugcontact - 85 mm)</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">brugcontact</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">—</td> <td style="border: none; padding: 5px 10px;">68</td> </tr> </table>				75	—	brugsein	(brugsein - 94 mm)	brugsein	—	70	78	—	brugcontact	(brugcontact - 85 mm)	brugcontact	—	68
75	—	brugsein	(brugsein - 94 mm)	brugsein	—	70											
78	—	brugcontact	(brugcontact - 85 mm)	brugcontact	—	68											
Opmerkingen: A8.1 De gemeten waarden zijn laag. Zie ook opmerking A6.3																	

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

B. HEF- EN BEWEGINGSMECHANISME VAN DE BRUG**1. Hefcilinder**


B1.1	Controle smeeroliepeil (1 cm onder ontluchting)	O	
B1.2	Controle op lekkage: hefmantel, draaicilinder, aansluitblok (hydr.) en koppelingen	O	
B1.3	Aftapbout smeerolie op hefmantel losnemen (smeerolie aanwezig)	O	
B1.4	Bevestiging taatshoed en lantaarnstuk	O	
B1.5	Bevestiging aansluitblok (hydraulisch)	O	
B1.6	Nazakken cilinder	O	
B1.7	Bevestiging hefbalken	O	
B1.8	Rubber sandwich opdrukblokken Speling tussen opdrukblokken en -balk (10 mm)	O	Zie schets
B1.9	Nazaktijd (elektrisch).	O	7 sec.
B1.10	Conditie opp. hefmantel (te beoordelen bij geheven brug)	O	
B1.11	Hefhoogte (350 mm)	O	
B1.12	Ruimte tussen opleggingen bij geheven stand brug	O	Zie schets B1.12

Opmerkingen:

B1.8

Bd

Drd



B. HEF- EN BEWEGINGSMECHANISME VAN DE BRUG


Opmerking

X / O

B1.12 Ruimte tussen opleggingen in opgezette stand: (mm)

←Bd

Drd →

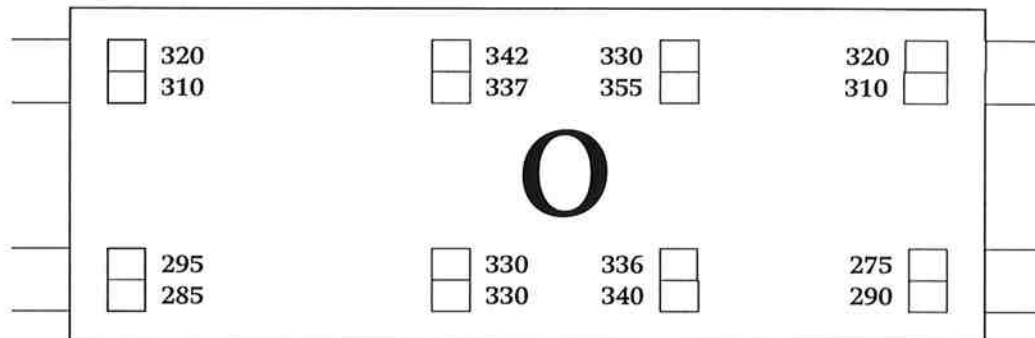

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

B. HEF- BEWEGINGSMECHANISME V/D BRUG**2. Meeneemconstructie**

B2.1	Toestand pen (geen beschadiging)	O	
B2.2	Bevestiging pen en naaf	O	
B2.3	Smering pen/naaf	O	
B2.4	Gedrag bij draaien	O	
B2.5	Gedrag bij opzetten	O	
B2.6	Controle op roestvorming	O	
B2.7	Toestand veer (geen breuk, roestvrij) werking veer controleren bij heffen	O	
B2.8	Bronzen tussenbus	O	
B2.9	Centr. pen/bronzen tussenbus bij heffen (vrij in bereden toestand)	O	
B2.10	Smering pen/tussenbus/huis	O	

3. Draaicilinder

B3.1	Bevestiging kruk aan hefcilinder	O	
B3.2	Bevestiging draaicilinder aan hefframe	O	
B3.3	Anti-tuimel schroeven	O	
B3.4	Geen beschadigingen op zuigerstang	O	
B3.5	Geen lekkage langs zuigerstang	O	
B3.6	Bevestiging leidingen	O	
B3.7	Bevestiging cilinder op stoel	O	
B3.8	Ankers stoel	O	
B3.9	Slangen	O/X	Zie opmerking

Opmerkingen:

B3.9 Geen inspectierapport/certicaat aangetroffen

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

C. POMPSET T.B.V. HET BRUG BEWEGINGSMECHANISME**1. Pompset**

C1.1	Controleren oliepeil	O	
C1.2	Zichtbare lekkage op mont. platen + koppelingen + pomp	O	
C1.3	Toestand filters	O	
C1.4	Vuilindicatie	O	
C1.5	Controleren werkdruk	O	heffen: 150 bar zakken: 50 bar
C1.6	Controleren max. druk		heffen: bar zakken: bar
C1.7	Controleren tijd t.b.v. heffen/zakken	O	heftijd: 33 sec. zaktijd: 32 sec. incl. nazakken: 39 sec.
C1.8	Noodbedrijf zakken (incl. nazakken)	X	Slot zit vast
C1.9	Elektrische nazaktijd	O	7 sec.
C1.10	Afsluiter in zuigleiding pomp in open stand geborgd	O	
C1.11	Pompstok voor handbed. aanwezig	O	
C1.12	Toestand hydraulische pomp	O	
C1.13	Controleren werkdruk draaibeweging	O	Zie opmerking
C1.14	Controleren max. druk draaibeweging		Niet uitgevoerd
C1.15	Controleren draaitijd		open: 51 sec. dicht: 41 sec.

Opmerkingen: egen.

C1.13 De gemeten werkdruk dicht:
150 bar tijdens aanzetten; 110 bar tijdens bewegen; 50 tijdens positioneren.
De gemeten werkdruk open:
70 bar tijdens aanzetting en 50 bar tijdens bewegen

C1.6 Niet uitgevoerd omdat het systeem voortijdig wordt afgeschakeld

C1.8 Noodbedrijf zakken is niet uitgevoerd omdat het slot vast zit.

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

D. OVERIGE INSPECTIEPUNTEN ALGEMEEN**1. Algemeen**

D1.1	Brugconstructie	O/X	Zie kwaliteitsrapport
D1.2	Staat landhoofden	O/X	Zie kwaliteitsrapport
D1.3	Staat pijler	O/X	Zie kwaliteitsrapport
D1.4	Spoorstaafovergangen		Zie blad 14
D1.5	Antikruip op brug		Zie opmerking
D1.6	Staat remmingwerk	O/X	Zie kwaliteitsrapport
D1.7	Vrijloop brugconstructie t.o.v. vaste constructiedelen	O	
D1.8	Verfwerk (beschad. etc.)	O/X	
D1.9	Buffers eindstanden brug	X	Zie opmerking
D1.10	Werking sleutelvergrendelkast	O	
D1.11	Handbediening sluiten	O	
D1.12	Algemene toestand elektrische apparatenkast (geen zichtbare beschadigingen of losse onderdelen)	O	
D1.13	Algemene toestand klemmenkasten (geen zichtbare beschadigingen of losse onderdelen)	O	

Opmerkingen:

D1.5 Van spoor Bd-Drd is de antikruip op de brug ingeslagen

D1.9 Aan de zijde van Drd is de buffer scheef afgezaagd.

De buffer is ca. 40% korter dan origineel, de tussenruimte met brug is 5 mm.

Draaibrug o/d Mark nabij Langeweg

Slecht = X Goed = O

Norm = (.....)

X / O

Opmerking

E. MEETRESULTATEN SPOORSTAAFOVERGANGEN

A = hoogteverschil (<1)

B = lengte (brug) spoorstaftong vanuit hart oplegging

C = lengte (baan) spoorstaftong vanuit hart oplegging

Zijde Lwg

A = <1 mm

B = 200 mm

C = 260 mm

A = <1 mm

B = 271 mm

C = 210 mm

Zijde Bd

A = <1 mm

B = 265 mm

C = 260 mm

A = <1 mm

B = 252 mm

C = 250 mm

Zijde Lwg

A = <1 mm

B = 259 mm

C = 274 mm

A = <1 mm

B = 266 mm

C = 271 mm

Zijde Bd

A = <1 mm

B = 275 mm


C = 250 mm

A = <1 mm



B = 285 mm


C = 240 mm


Opmerkingen: Verklaring welke letters bij welke positie

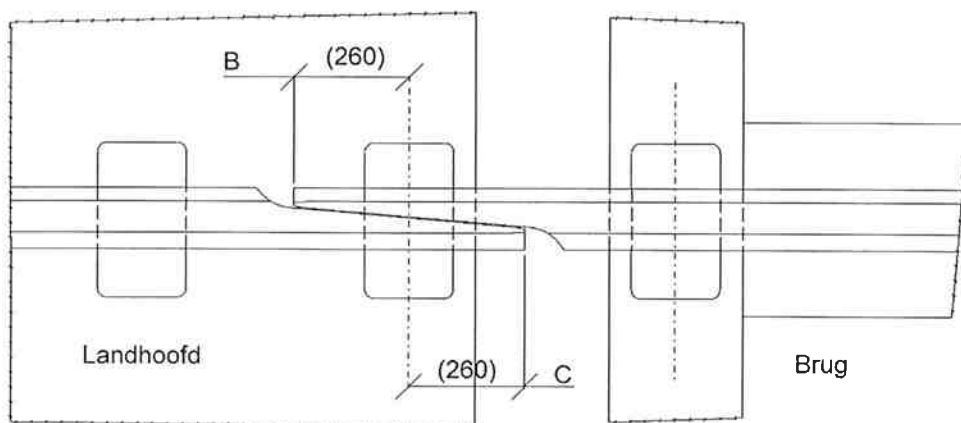




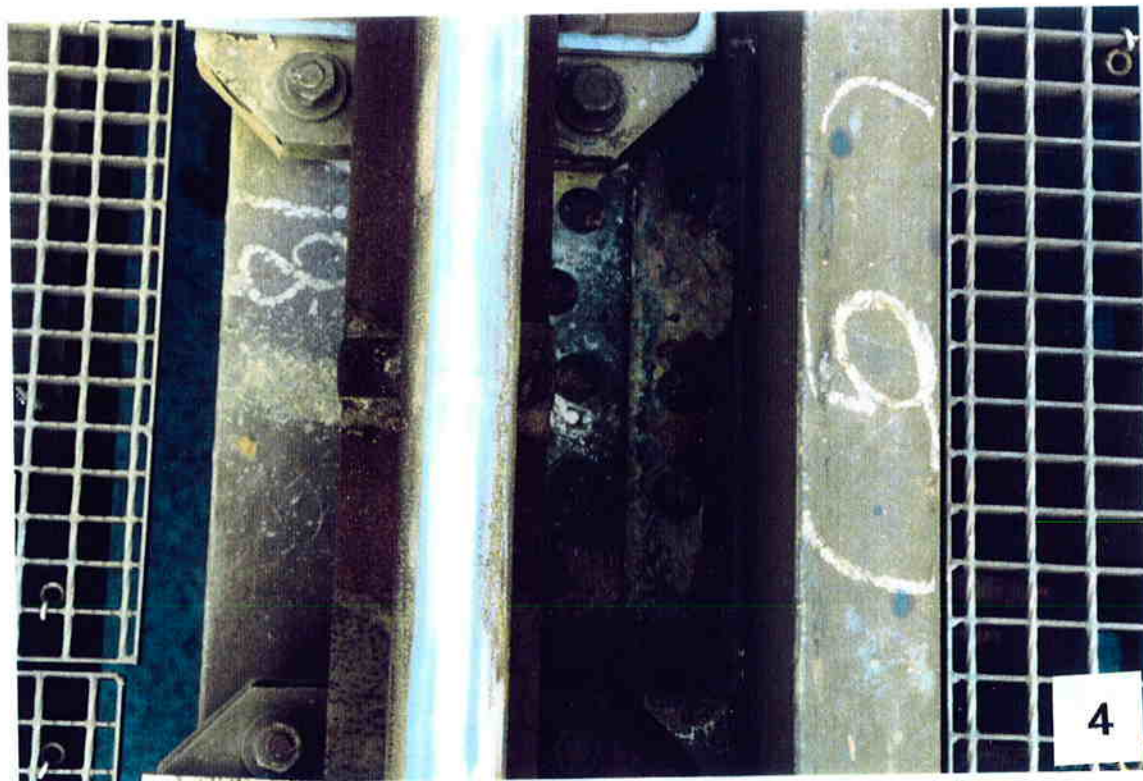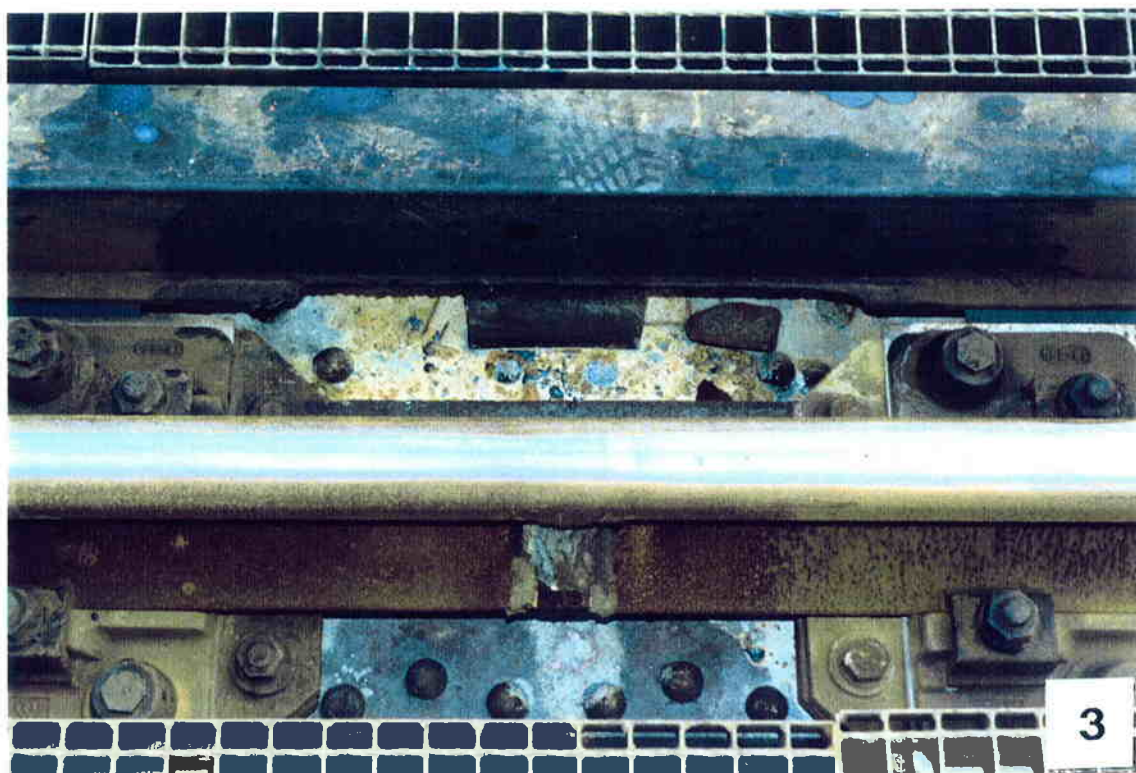


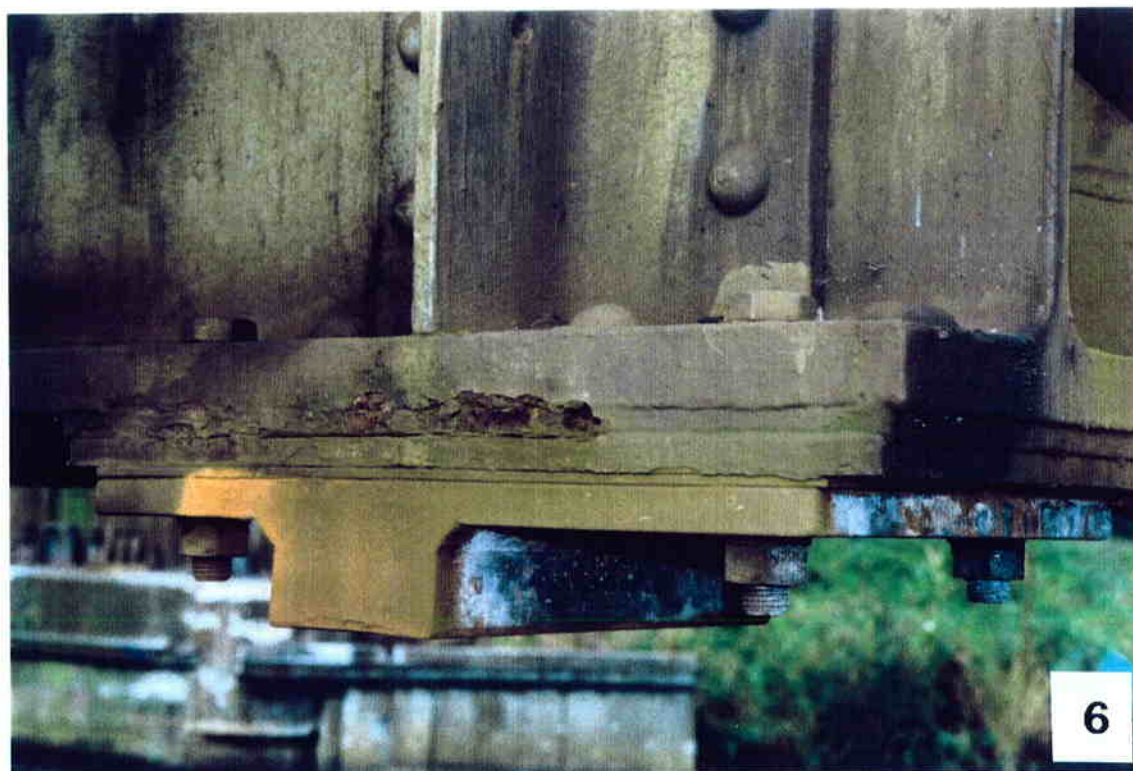


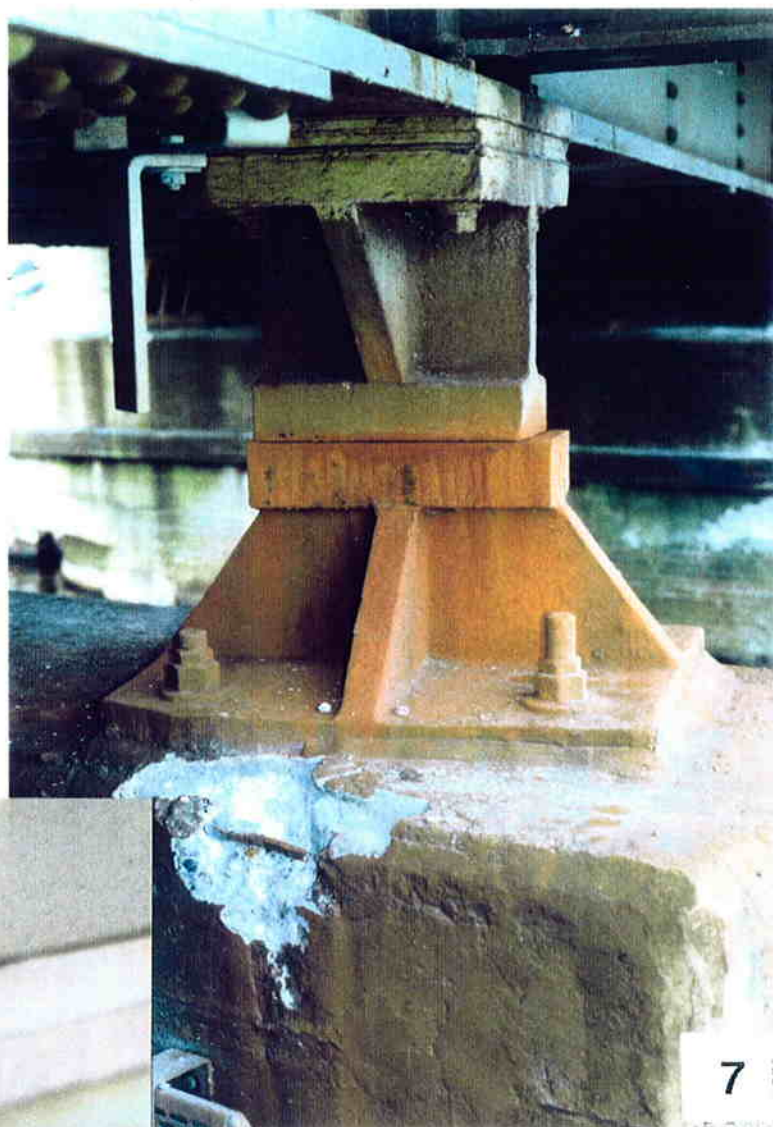




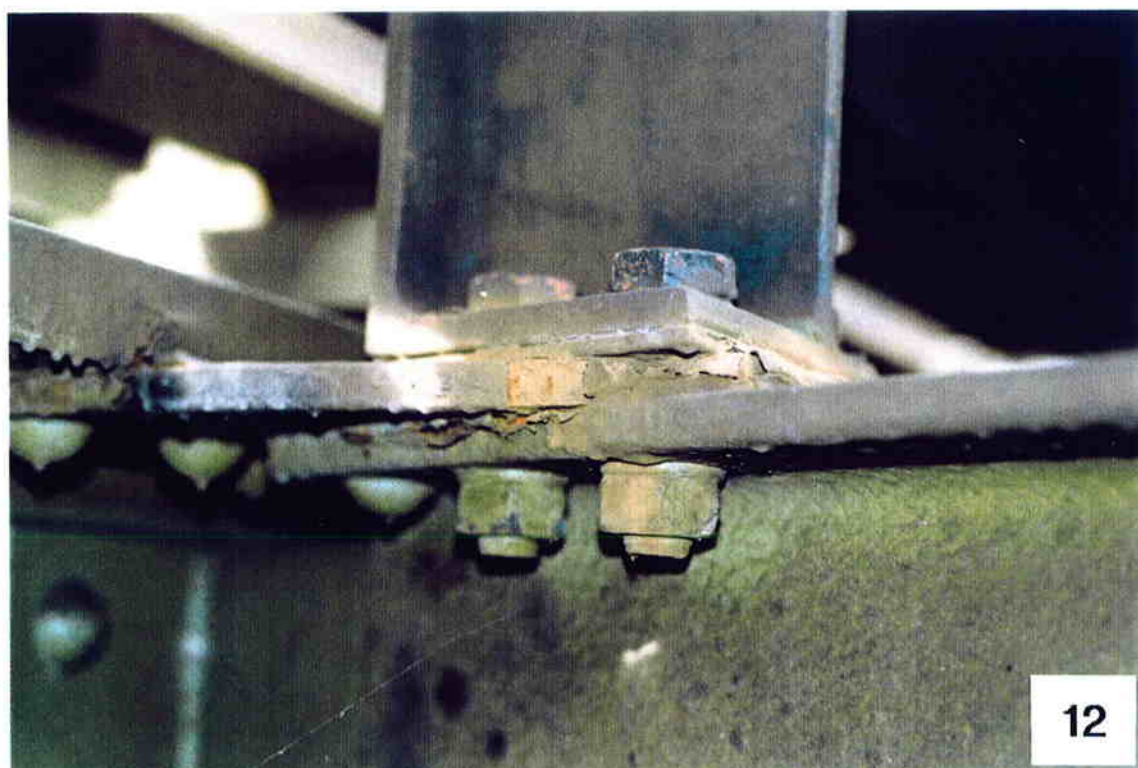

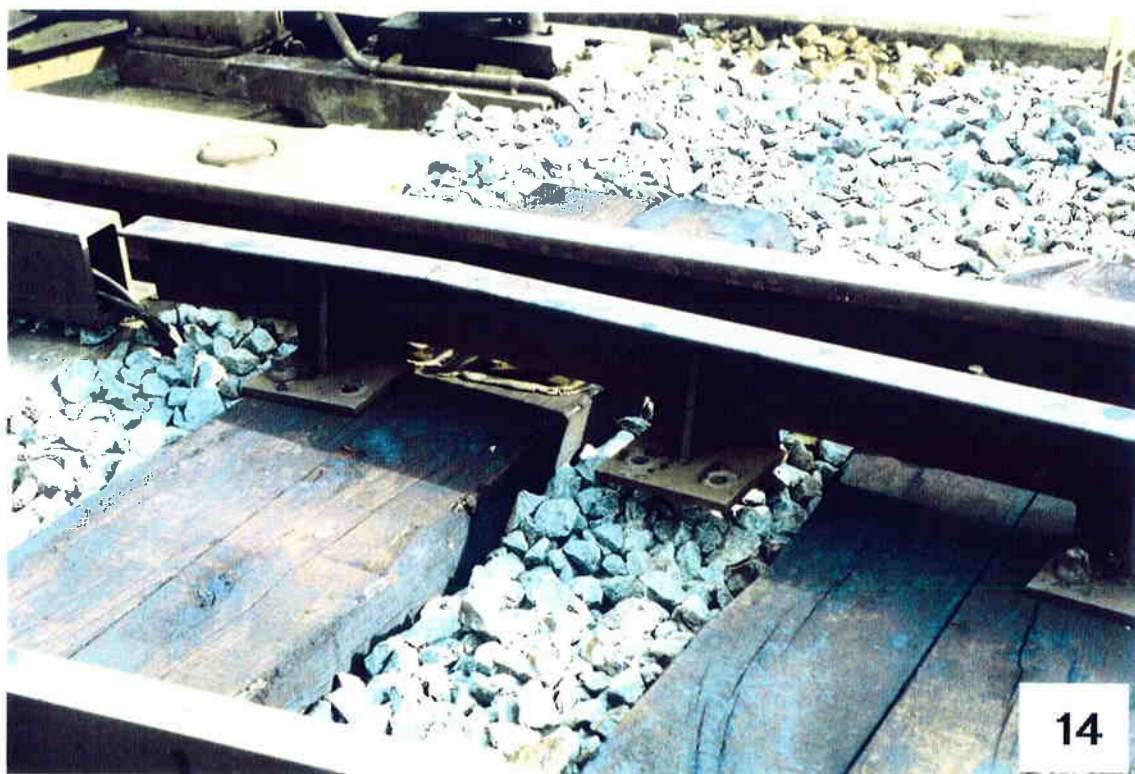


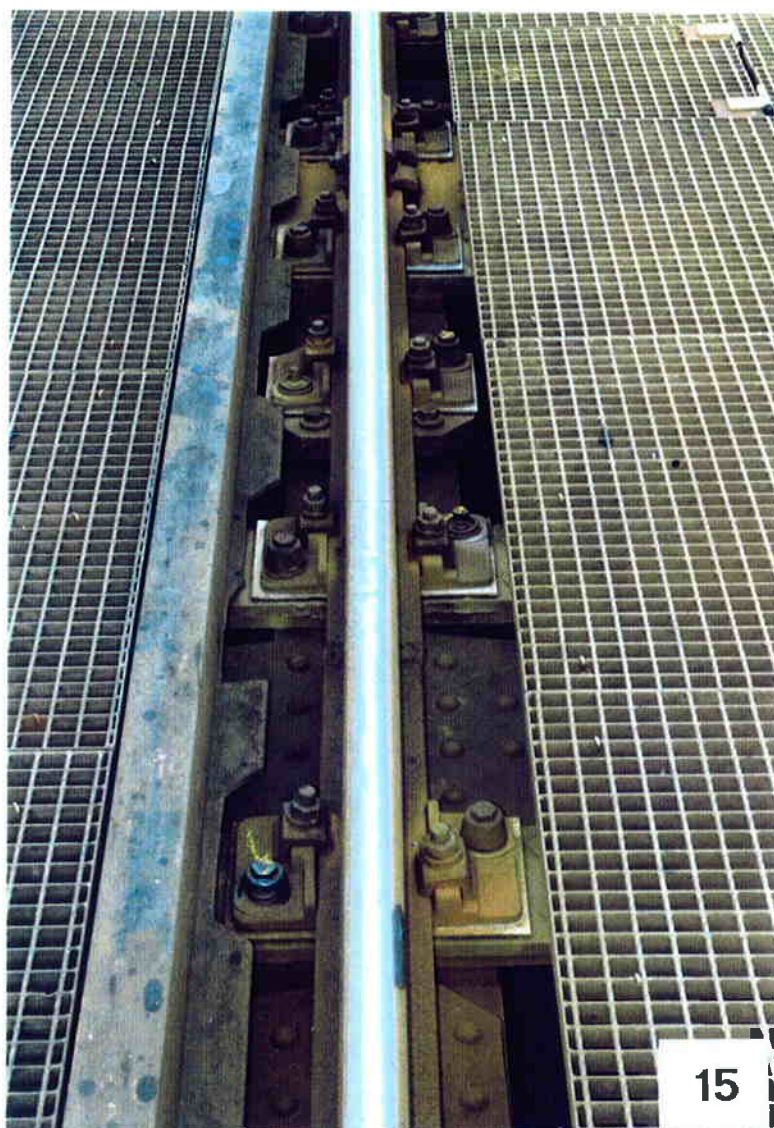

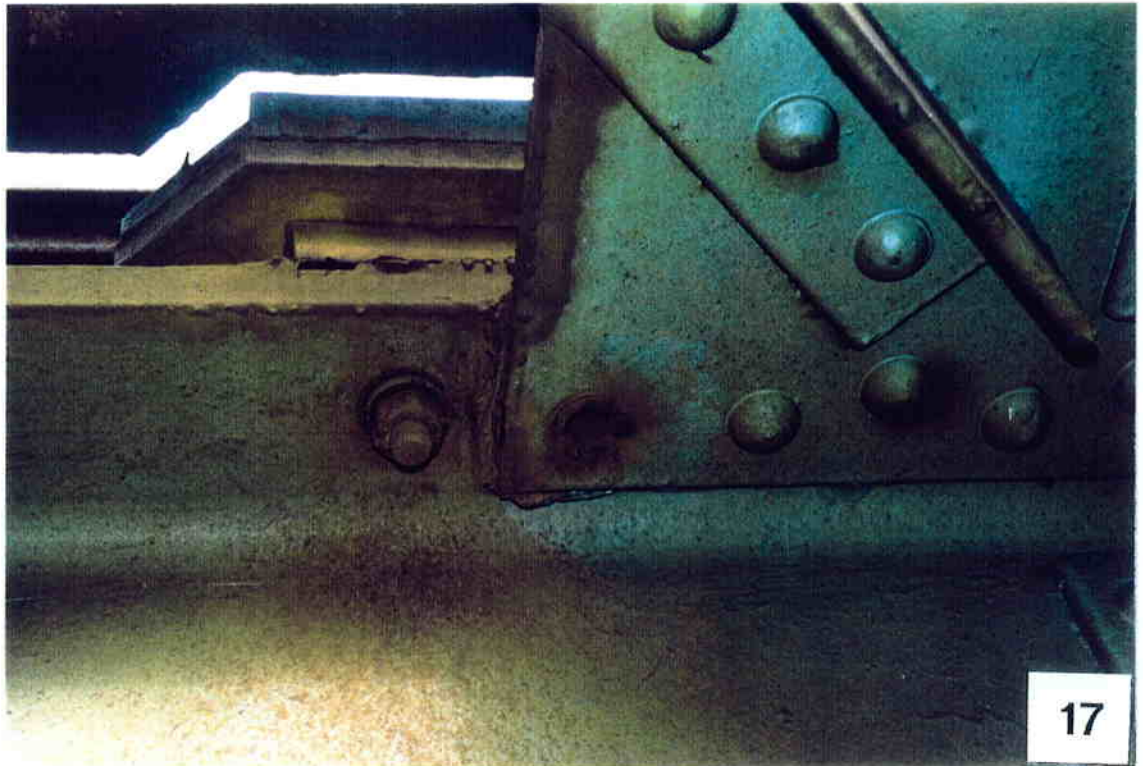





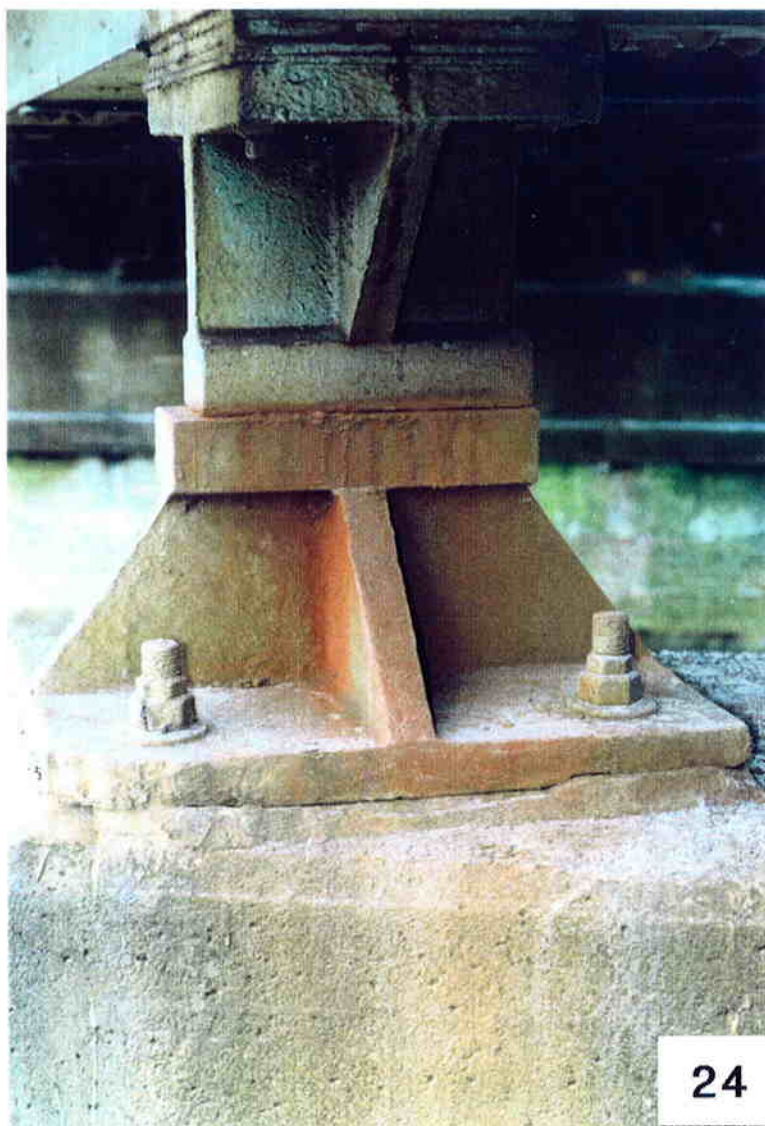



NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN
Railinfrabeheer
Sector Kunstwerken, Gebouwen en Installaties

Checklist bewegingswerk

Object : Draaibrug o/d Mark
nabij Langeweg

Lijncode : 121 km: 8.620

Regio : RIB Zuid

Datum : 15/10/1998

Inhoud:

A] MECHANISCHE CONTROLE-INRICHTING / GRENDELINRICHTING.

1. Pompset t.b.v. de aandrijfeenheid
2. Aandrijfeenheid schieters en spoorstaafcontrole
3. Universele aandrijfeenheid grendel
4. Stangen en assen
5. Schieters en afsluitlantaarns
6. Spoorstaafcontrole
7. Muurgrendel en centreerpen
8. Afstelwaarden brugseinkoppeling, brugcontactinrichting

B] HEF EN BEWEGINGSMECHANISME VAN DE BRUG


1. Hefcilinder
2. Meeneemconstructie
3. Draaibilinder

C] POMPSET T.B.V. HET BRUGBEWEGINGSMECHANISME

D] OVERIGE INSPECTIEPUNTEN

E] MEETRESULTATEN SPOORSTAAFOVERGANGEN

SITUATIE TEKENING
Schematisering; niet op schaal

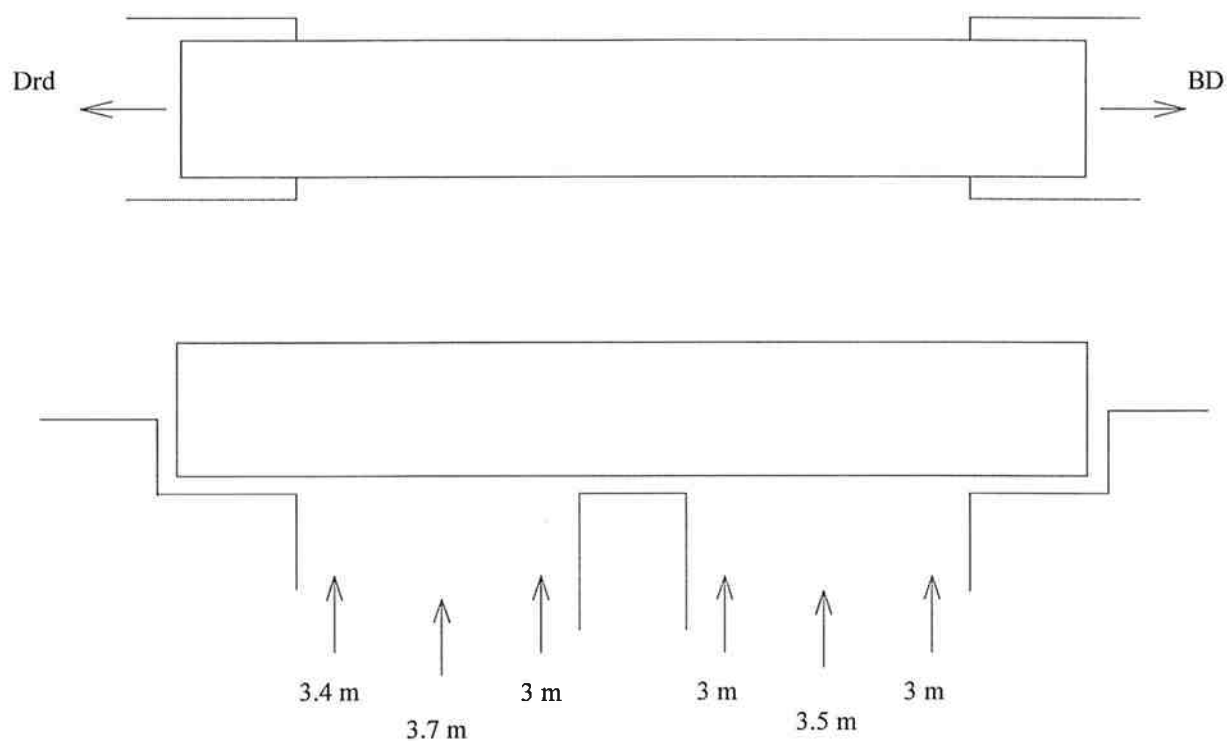

Wijzigingsblad		OVERZICHT KUNSTWERK		december 1998	
Lijncode	: 121	Kilometer	: 008.620		
Regio	: Zuid	Beheergebied	: Zuidwest		
Gemeente	: Terheiden				
Naam kunstwerk	: Mark Langeweg				
Aantal vaste bruggen	: 0	Aantal beweegbaar	: 1		
Kunstwerknummer	: 1				
Type kunstwerk	:				
Soort spoor	:	Aantal sporen	: 2		
Type constructie	:				
Aantal overspanningen	: 3	Aantal draagwerkeenh.	: 3		
Eigenaar	:	Onderhoud	:		
Wegbeheerder	:				
Waterbeheerder	:				
Overeenkomst	:				
Bouwjaar	:	Bouwjaar onderbouw	:		
Renovatiejaar	:				
Aanneemsom	: f	Vervangingswaarde	: f		
Normuren	:	Moderniteit	:		
Berekening aanwezig	:	[J/N] Tekening aanwezig	:		[J/N]
Ber. vlgs laststelsel	:	Laatste kwal. opname	: 1998		
Opmerkingen	:				
Sit. bebouwde kom	:	Bereikbaarheid	:		
Stootplaten aanwezig	:	[J/N]			
Baanvaknelheid	:	[Km/h] Snelheid tpv kunstwerk	:		[Km/h]
Geëlectr. baanvak	:	[J/N] Jaartonnage	:		[ton]
Type fundering	:				
Type oplegging	:				
Type spoor	: 2	Comp.las/inr. aanwezig	: N		[J/N]
Type spoorstaaf bev.	:				
Verkanting	:	[mm] Spoor in boog	:		[J/N]
H.o.h. spoor	: 4000	[mm]			
P.v. voorzieningen	: 1	WIBR of WUBO aanw.	: N		[J/N]
Lengte kunstwerk	:	[mm] Constructiehoogte	: 1300		[mm]
Doorvaart/rij hoogte	: 2950	[mm] Doorvaartdiepte	:		[mm]
Doorvaart/rij breedte	:	[mm]			
NAP onderkant KW	: 2950	[mm]			
H.o.h. hoofdligger	:	[mm] H.o.h. dwarsdrager	:		[mm]
Groefwijdte	:	[mm] Anti-wip	: Geen		
Gewicht	:	[ton]			
Windverband aanw.	:	[J/N] Slingerverband aanw.	:		[J/N]
Type raveling	:	Type rijvloer	:		
Type geleidebalk	:	Type puntstuk	:		
Aantal insp.wagens	:	H.o.h. insp.wagenrail	:		[mm]
Laatste verfbehandeling	:	Applicateur	:		
Verfsysteem	:	m ² -schilderwerk	:		[m ²]
Bijzonderheden verf	:				
Afstempeling aanwezig	:	[J/N] Beton reparatie/injectie	: 1998		
Kwaliteitsgegevens	: J	[J/N] Sterktetechn. gegevens	:		[J/N]

Wijzigingsblad		OVERZICHT KUNSTWERK		december 1998	
Lijncode	: 121	Kilometer	: 008.620		
Regio	: Zuid	Beheergebied	: Zuidwest		
Gemeente	: Terheijden				
Naam kunstwerk	: Mark Langeweg				
Aantal vaste bruggen	: 0	Aantal beweegbaar	: 1		
Bewegingswerk	: H				
Jaar bewegingswerk	: 1994				
Bedienaar	: NS	Bediening vanuit	: Afstand		
Normaal stand	: G	Drvt hgt geopend	: 7000 mm		
Hefhoogte	: 300 mm				
Muurgrendel aanwezig	: J	[J/N]	Centreerinricht. aanw..	: J	[J/N]
Bovenleiding aanwezig	: J	[J/N]			
Overgangsconstructie	: 2				
Type sps. overgang	: 1				
Type opzetwerk	: H				
Scheepvaartseinen	: A-sein				
Bewegingstijd netto	: 1.35	[min]	Bewegingstijd bruto	: 1.30	[min]

Schade aan:	Nadere aanduiding:	m ² :	%	Foto nr.
1. CONSERVERING				
1.1 Langsliggers	Lichte roestvorming/ernstige vervuiling		>1	2-3-4
1.2 Dwarsdragers				
1.3 Coupes				
1.4 Hoofdliggers				
1.5 Diagonalen				
1.6 Vertikalen				
1.7 Verbanden	Lichte roestvorming/vervuiling		>1	5
1.8 Opleggingen	Vulplaten roestvorming/vervuiling		>1	6-7
1.9 Oude constructiedelen	Roestvorming/verfonthechting		>2	8
1.10				
1.11				
1.12				

OPMERKINGEN:

- 1.1 Op diverse plaatsen lichte roestschade en op de bovenflens ernstige vervuiling en brandschade door termietlassen.
- 1.8 Lichte roestvorming van de oplegplaten en ernstige vervuiling door roestwater.
- 1.9 Oude constructie van de rollenbaan heeft op enkele plaatsen roestvorming en verfonthechting.

Schade aan:	Nadere aanduiding:	m ² :	%	Foto nr.
2. STERKTE				
2.1 Langsliggers	Lichte roestvorming		>2	9
2.2 Dwarsdragers				
2.3 Coupes				
2.4 Hoofdliggers				
2.5 Diagonalen				
2.6 Vertikalen				
2.7 Verbanden	Lichte roestvorming van koppelingen		>2	5
2.8 Opleggingen	Ankermoeren roestvorming/ 2 stuks los		>2	10-11
2.9				
2.10 Excentriciteit spoor				
2.11 Geometrie spoor	6 a 7 dwl's slaan voor/achter de brug			
2.12				

OPMERKINGEN:

- 2.8 Ankermoeren zijn door roest aangetast, in totaal 6 stuks en 2 stuks ankermoeren zijn los.
Van de opleggingen zijn meerdere opsluitnokken afgebroken, aan de zijde Breda 2 stuks en aan de zijde Dordrecht 1 stuks (zie foto nr. 18 en 19).

Schade aan:	Nadere aanduiding:	Hoeveelh.	Foto nr.
3. VEILIGHEIDSASPECTEN			
3.1 Geleidebalken	Bevestigingsbouten los	8 stuks	12-13
3.2 Puntstukken	Afwijkende verdeling van kraagbouten		14
3.3 Spoorwijdte	Min: 1440 Max: 1448		
3.4 Spoorligging	Bev.bouten afgebroken/verslagen	8 stuks	15-16-17
3.5 Opleggingen	Scheluwte: spoor 7 mm/brug 9 mm		
3.6 Pijlers	Zie opmerkingen		18-19
3.7 Landhoofden	Zie opmerkingen		20-21-22
3.8			
3.9			
3.10			
3.11			
3.12			

OPMERKINGEN:

- 3.2 Door een afwijkende verdeling van de dwl's komen de bevestigingsgaten van het puntstuk niet overeen met de gaten in de stoeltjes. Eén van de puntstukken is over een afstand van ca. 2 m slechts bevestigd met één kraagbout.
- 3.3 Van de rughellingplaten zijn 8 stuks bevestigingsbouten afgebroken. Van de overgangsconstructie aan de zijde Breda zijn meerdere ankers los en de isolatie platen verslagen.
- 3.6 +3.7 Tijdens inspectie worden er betonrenovatie werkzaamheden uitgevoerd.

Schade aan:	Nadere aanduiding:	Foto nr.
4. DIVERSE ONDERDELEN		
4.1 Roostervloer	Enkele roosters vervormd	23
4.2 Ondersabeling	Lichte afbrokkeling van afwerkrand	24
4.3 Compensatie las		
4.4 Compensatie inrichting		
4.5 Broekbalken		
4.6 Roestplaten		
4.7 Waterafvoer		
4.8 Remmingwerk	Op waterlijn zijn palen verrot en aangroei van planten	25
4.9 Kabelkoker		
4.10 Bebording		
4.11 Leuning		
4.12 Fiets/voetpad	Niveau verschil / pad binnen PVR	26
4.13 Onderkapping		
4.14 Toegankelijk voor derden		
4.15 Overweg aanwezig		
4.16 Rijtijd RUW	Beide zijden >30 sec.	
4.17 Aanrijdvoorzieningen		
4.18		

OPMERKINGEN

- 4.12 Bij de aansluiting van het passerpad met de brug is het niveau verschil ca. 15 cm. De breedte van het voetpad op de brug is minder dan <2.50 m vanuit hart spoor.

Conclusie/aanbeveling:

De brug verkeert in een matige staat. Speciale aandacht wordt gevraagd voor:

- Het voetpad op de brug ligt binnen PVR en is bij de overgang een struikelobject (punt 4.12).
- Slaande dwl's voor en achter de brug (2.11)
- De puntstukken zijn beperkt bevestigd (punt 3.2)
- Van de opleggingen zijn 3 opsluitnokken afgebroken. Het is raadzaam om nader te onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen hiervan (punt 2.8).
- Spoorwijdte (punt 3.3).

Voor het bewegingswerk wordt de aandacht gevraagd voor:

- De maximale druk van de MCI is aan de hoge kant (punt A1.3).
- Het slot van de muurgrendel gaat zwaar, in geval van een calamiteit is het mogelijk dat de sleutel afbreekt (punt A3.10)
- De schieters aan afsluitlantaarns zijn onvoldoende gesmeerd. Extra aandacht voor de schieters zijde Dordrecht (punt A5.1, A5.4 en A5.8)
- De afstelmaten van de schieters tot de Ertalonplaten zijn groot (punt A6.3). De Ertalonplaten van de spoorstaafcontrole worden niet gecontroleerd als de schieter 20 mm van het brugcontact staat. De afstelmaten van het brugsein en brugcontact zijn klein (punt A8.1)
De combinatie van beide factoren kan de veilige werking van de brug negatief beïnvloeden.
- De positie van de brug bij het vergrendelen is kritiek: de grendelpunt loopt tegen de zijkant van de centreeropening en dwingt vervolgens de brug in de juiste positie (punt A7.4/A7.5)
- Het C-slot van het noodbedrijf zakken is niet bedienbaar, hierdoor is het niet mogelijk de brug op handbediening te laten zakken (punt C1.8)

BRUG NR: 1 KWALITEITSMEEZYSTEEM VASTE STALEN BRUGGEN														
CONSERVERING					STERKTE					VEILIGHEID				
Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f	Onderdeel	Beoord.asp.	code	fact.	Q=k*f
RIJvloER	roestvorm.	6	5	30	RIJvloER	drsn.verm.	8	5	40	geleidebalken/punstukken	verb.midd.	5	1	5
langsliggers	% opp.				langsliggers	vervorming					doorsnede	9	1	9
coupees	verfdikte	6	2	12	dwarsdragers	verb.m.	10	5	50		vermind.			
HOOFDCONSTR.	roestvorm.		0	0	HOOFDCONSTR.	drsn. verm.		0	0	spoorwijdte	afwijking	1	2	2
onder-/bovenranden	% opp.				onder-/bovenrande	vervorming				1435				
diagonalen	verfdikte		0	0	diagonalen	verb.m.		0	0					
vertikalen					vertikalen					spoorligging	verb.midd.	7	1	7
OVERIG	roestvorm.	5	1	5	OVERIG	drsn.verm.	8	1	8		antiwip			
verbanden/opl.	% opp.				verbanden/opl.	vervorming					scheluwte	4	1	4
											uitvullen	6	1	6
	verfdikte	6	1	6		verb.m.	6	1	6		dwl's			
TOTAAL			9	53	SPOOR	excentri.	10	3	30	opleggingen	scheluwte	2	1	2
K.waarde CONSERVERING = tot. Q / tot. fact.						geometrie	1	5	5		brug			
						overgang								
TOTAAL					TOTAAL					TOTAAL				
					20					11				
K.waarde CONSERVERING = tot. Q / tot. fact.					K.waarde STERKTE = tot. Q / tot. fact.					K.waarde VEILIGHEID = tot. Q / tot. fact.				
					7,0					5,2				

