



Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsontwerpplan
behorende bij project

Onderdoorgang Europalaan Gilze Rijen

lijncode 123, km 11.720
In Gilze Rijen.

Besteknummer V40 BK 09450

Projectnummer : 3362704
Documentcode : 3362704/MG/B
Versie : 1.0
Versiedatum : 25 november 1998
Status : Vrijgegeven
Opgesteld door : ing. M.H. Gerdessen

versie:	1.0	Status	Vrijgegeven
	Naam:	Paraaf:	Datum:
Opsteller	M.H. Gerdessen		26/11/98
Projectleider	C.F. Vink		26/11/98

Inhoudsopgave

1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS	3
1.1 Globale omschrijving van het te realiseren bouwwerk:	3
1.2 Adres/Gemeente van de bouwlocatie:	3
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen	3
1.4 Uitvoeringsgegevens (voorzover reeds bekend)	4
1.5 Bouwplanning en Fasering	5
2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (EXCLUSIEF SPOORWEGVEILIGHEID)	6
2.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend).	6
2.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp.	7
3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (SPOORWEGVEILIGHEID)	9
3.1 Pragraaf spoorwegveiligheid Ontwerpfase	9
3.2 Situatie ter plaatse	10
3.3 Werkplekbeveiligingsklasse	10
3.4 Toegang tot de werkplek	10
3.5 Aan- en afvoer materialen	10
4 TOETSING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN DOOR DESKUNDIGE	11
1 Register	1
2 Inhoud V&G-dossier	1
3. Overdrachtsdocument	1

BIJLAGE 1 A V&G-DOSSIER

BIJLAGE 1 B MODEL ACTIELIJST BIJ ONREGELMATIGHEDEN

Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsontwerpplan

1 Algemene projectgegevens

1.1 Globale omschrijving van het te realiseren bouwwerk:

Het werk betreft de bouw van een onderdoorgang t.b.v. wegverkeer in de spoorlijn Breda - Tilburg nabij de Europalaan, in de gemeente Gilze Rijen. De bestaande overweg in de Achterweg wordt gesloopt.

1.2 Adres/Gemeente van de bouwlocatie:

De te realiseren onderdoorgang is gelegen in de gemeente Gilze en Rijen, in de Europalaan, lijncode 123, km 11.720.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

a Opdrachtgever(s)

Naam	:	NS Railinfrabeheer Regio Zuid
Adres	:	Postbus 6433
Postcode/plaats	:	5600 HK EINDHOVEN
Contactpersoon	:	ing. P.L.M. van Betuw
Telefoon	:	040 - 233 47 01
Fax	:	040 - 233 48 58

b. Ontwerpende partij

Naam	:	Holland Railconsult
Adres	:	Postbus 2855
Postcode/plaats	:	3500 GW Utrecht
Telefoon	:	(030) 235 87 57
Fax	:	(030) 235 72 29

c V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam	:	ing. C.F. Vink
Bedrijf	:	Holland Railconsult
Vakafdeling	:	Civiele Techniek
Telefoon	:	(030) 235 83 71
Fax	:	(030) 235 72 29

1.4 Uitvoeringsgegevens (voorzover reeds bekend)

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

27 januari 1999

1.4.2 Geplande bouwtijd:

11 maanden.

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

30

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

5

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

n.v.t.

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

Nog niet bekend.

1.4.7 Regeling coördinatie bij nevenaanneming

De coördinatie m.b.t. de verschillende V&G-plannen inclusief de spoorwegveiligheid (RVW) geschiedt door de aannemer van bestek:

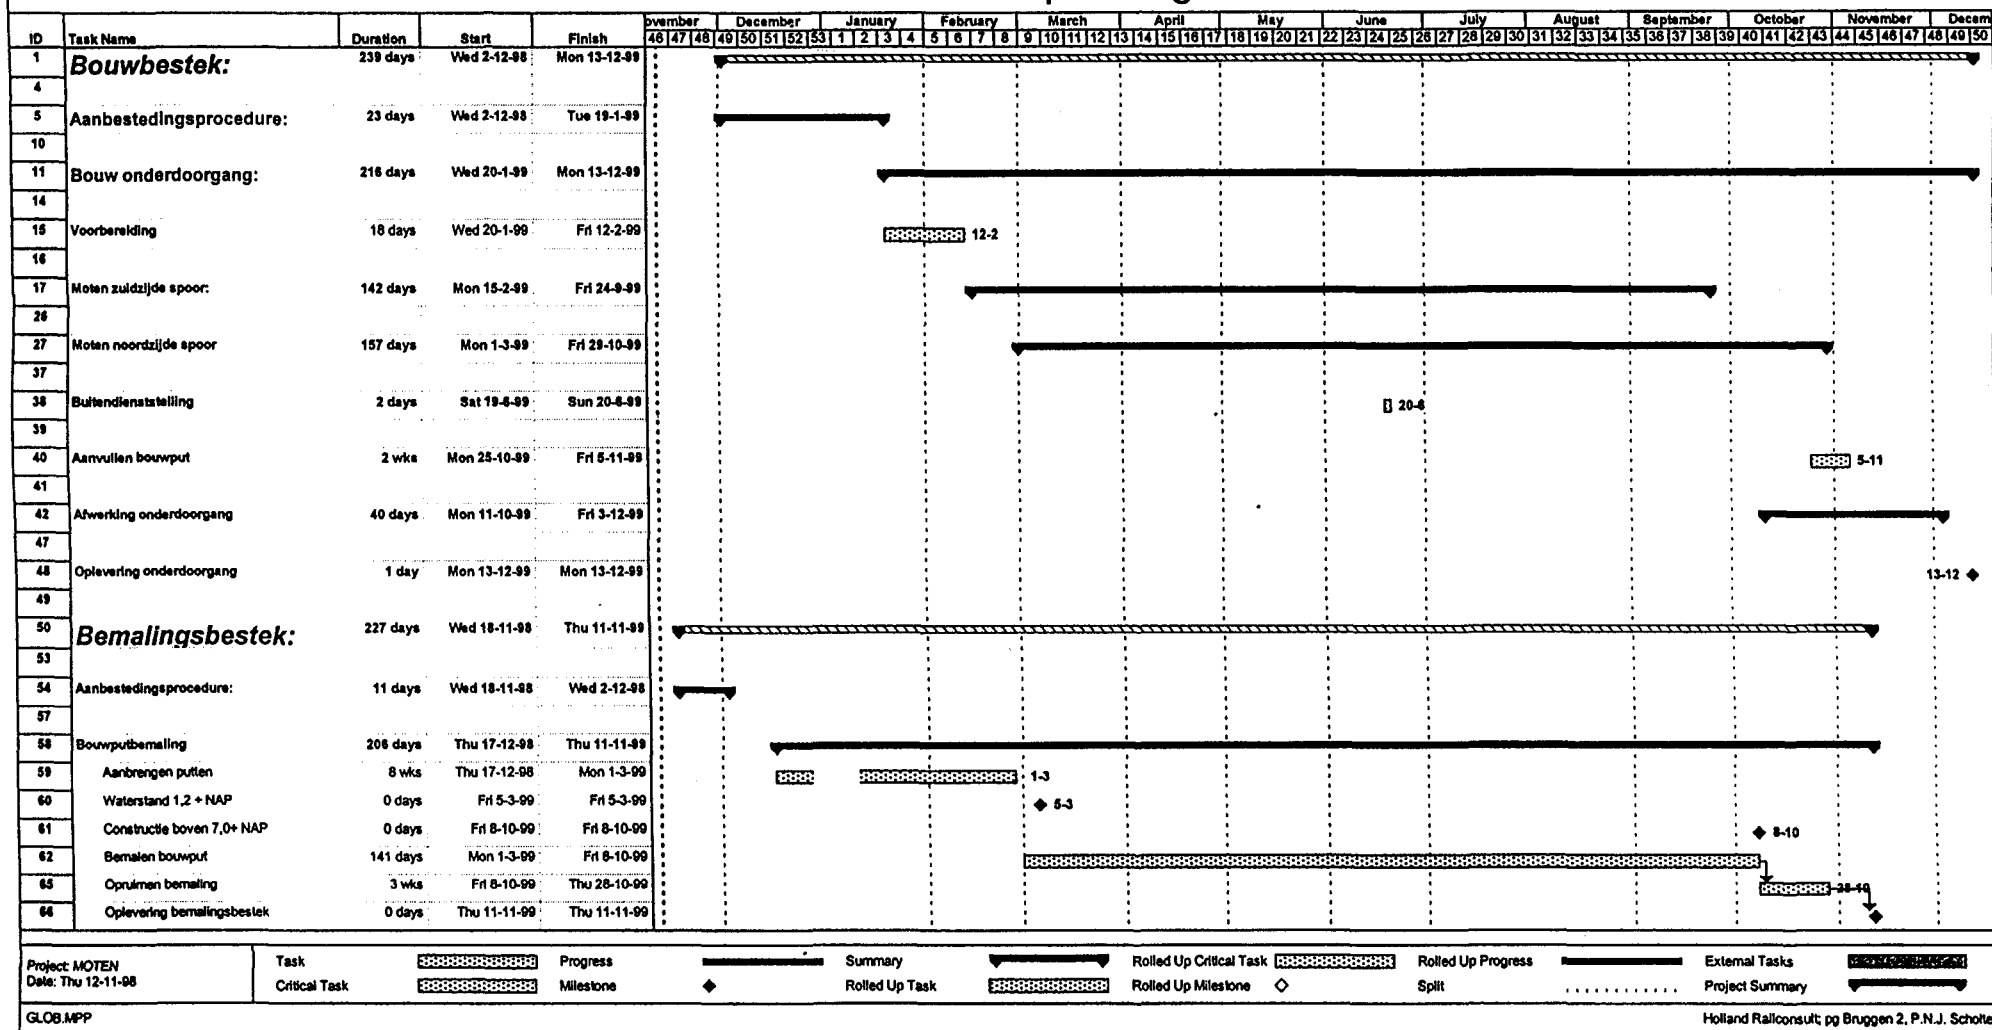
V40 BK 09450

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

- Bemaling (Bestek V40 BK 09675)
- Aansluitende wegen
- Wegverhardingen
- Kabels en leidingen

1.5 Bouwplanning en Fasering

Gilze-Rijen: Onderdoorgang Europalaan Globale bouwplanning



2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (exclusief spoorwegveiligheid)

2.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend).

Omgevingsfactor	Bestekspost/Tekening	Activiteit	V&G-risico	(Suggestie) te nemen maatregel
1. Verkeerswegen	Algemeen	Diversen	Aanrijdingsgevaar Vallen van voorwerpen/personen	Afzetten/omleiding verkeersweg Zie P-bladen
2. Spoorwegen	Algemeen	Plaatsen damwanden transport- en hijswerkzaamheden	Aanrijdingsgevaar door treinen, omvallen (mobiele werktuigen)	Veiligheidspersoneel stellen, spoorbaan afschermen d.m.v. hekken e.d.o
3. Hoogspanningskabels (incl. bovenleiding 1500 Volt)	Algemeen	Hijswerk en plaatsen damwand	Blootstelling aan hoge elektrische spanningen: elektrocutie Omvallen mobiele werktuigen	Aarding machines Werktuigen opstellen op dragline schotten
4. Kabels en leidingen	Algemeen	Graafwerkzaamheden Plaatsen damwanden	Lekkage, elektrocutie, ontploffing	Lokaliseren (proefsleuven graven), markeren, KLIC- melding
5. Explosieven	Algemeen	Ontgraven bouwputten Plaatsen damwanden	Ontploffing	Werk stilleggen, personen op afstand houden, politie/centrale meldkamer waarschuwen 030 - 235 44 44
6. Bodem - en waterverontreiniging	Algemeen (Zie ook rapport: Gilze Rijen onderdoorgang, verkennend milieukundig bodemonderzoek; kenmerk: FK/VC/70928 - versie 01; status : vrijgegeven d.d. 16 juli 1997)	Verontreinigde grond Vervuilde ballast	Vrijkomen giftige stoffen Milieuverontreiniging	Milieuonderzoek Directie inlichten Hergebruik grond

2.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp.

Bouwfase/projectonderdeel	Bestekspost/Tekening	Activiteit	V&G-risico	(Suggestie) te nemen maatregel
1. Grondwerken	Algemeen	Ontgraven bouwkuip	Slipgevaar Aanrijdingsgevaar Instabiliteit van de bouwkuip Instortingsgevaar/bedelving	Transporten morsvrij laten plaatsvinden, wagens van akoestische installatie voorzien. Hellingen van ontgraving niet te steil
2. Kabel- en leidingwerk	Algemeen	Om- en verleggen kabels en leidingen	Elektrocutie Aanrijdingsgevaar	Werkzaamheden uitvoeren onder toezicht en door bevoegd personeel Leidingen deugdelijk beschermen (NS kabels en leidingen leggen in kabelkokers) Aanbrengen afscherming werkplek
3. Spoorwerk	Algemeen	Spooronderhoud	Aanrijdingsgevaar door treinen	Veiligheidspersoneel aanstellen / waarschuwingsapparatuur
4. Hulpwerken	Algemeen	Plaatsen damwanden Aanbrengen en verwijderen grondkerende constructies	Instabiliteit van de bouwkuip Instortingsgevaar / bedelving	Hellingen van ontgraving niet te steil
5. Betonwerken	Algemeen	Werken op verschillende niveaus boven elkaar Hijswerk zie put 6	Vallen van bekisting, vallen van hoogte	Bekistingen voorzien van deugdelijke looppaden met leuning Coördinerend overleg noodzakelijk
6. Hijswerkzaamheden en inbrengen damwanden	Algemeen	Onderdelen inhijsen Hijsen/intrillen bij wind	Vallen van voorwerpen/personen Omvalen van (mobiel)	Zie P-bladen Keuring hijskraan

Bouwfase/projectonderdeel	Bestekspost/Tekening	Activiteit	V&G-risico	(Suggestie) te nemen maatregel
		Hijsen in de nabijheid bovenleiding	hijswerktuig Veiligheid trein- en weg verkeer Elektrocucie	Hijswerkzaamheden verboden bij wind boven 7 op de schaal van Beaufort Machine stellen op dragline schotten Machines aarden
7. Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	Transporten / graaf- en heiwerkzaamheden, uit- en inrit bouwterrein	Werkzaamheden in de nabijheid van de spoorbaan Verkeersstromen tussen noord- en zuidzijde spoorbaan via overweg en openbare weg (en vice versa)	Aanrijdingsgevaar Vallen voorwerpen	Afscheidingen, plaatsen bebordingen en voorzien van verlichting
8. Stof	Algemeen	Algemeen	Oogletsel Stoflongen	Dragen veiligheidsbril Dragen stofmasker
9. Bouwlawaai	Algemeen	Compressoren	Gehoorletsel	Dragen gehoorbescherming Geluiddemping
10. Bouwplaatsvoorzieningen	Algemeen	Werken voor zonsopgang of na zonsondergang (bij kunstlicht) Het zich bevinden op het werkterrein	Verblinding van bestuurders	Aandacht voor verblinding tijdens plaatsen bouwverlichting Bouwhekken plaatsen

3. Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (spoorwegveiligheid)

3.1 Paragraaf spoorwegveiligheid Ontwerpfase

Algemene projectgegevens				
Project: Onderdoorgang Europalaan te Gilze Rijen Baanvak: 123 Sporen: 2 t.p.v. km. 11.720		opdrachtgever: NS Railinfrabeheer Ontwerpende partij: Holland Railconsult V&G-coördinator ontwerpfase: ing. C.F. Vink Adres: Daalseplein 101 Postcode/Plaats: 3511 SX UTRECHT tel.nr.: 030 - 235 89 58		Opgesteld door: ing. M.H. Gerdessen tel.nr.: 030 - 235 87 88 Datum: 26-11-1998 Uitgave: 1.0 Goedgekeurd door: Handtekening:
Risico-inventarisatie			Risico-evaluatie en maatregelen	
Activiteit	Locatie	Risico-oorzaak	Aanrijdgevaar	Elektrocutiegevaar
Opname/inmeten/onderzoek project	Buiten pvr, maar binnen pvr + 3 m.	Onbedoeld in het pvr komen van medewerkers	Vhm stellen	Geen
Opname/inmeten/onderzoek project	Binnen pvr	Pvr vrij binnen 5 sec, zicht > 30 sec > 2 treinen per uur	Vhm stellen	Geen
Toezicht op bouwactiviteiten	Binnen pvr	Pvr vrij binnen 5 sec, zicht > 30 sec > 2 treinen per uur		
Verplaatsen over het schouwpad	Buiten pvr, maar binnen pvr + 3 m.	Geen	Alleen werkende eigen veiligheid	Geen
Aanwijzing/voorlichting/ opleveringscontrole project	Buiten pvr, maar binnen pvr + 3 m.	Onbedoeld in het pvr komen van medewerkers	Vhm stellen	Geen
Bouwen onderdoorgang	Buiten pvr, maar binnen pvr + 3 m.	Onbedoeld in het pvr komen van medewerkers	Afschermen d.m.v. een fysieke afscheiding of vhm stellen	Bij werkzaamheden nabij de bovenleiding veiligheidsdeskundige stellen
Bouwen onderdoorgang	Binnen pvr	Pvr niet vrij binnen 180 sec.	Buitendienst/spanningloosstelling	
Opnemen spoorwegovergang	Buiten pvr, maar binnen pvr + 3 m.	Onbedoeld in het pvr komen van medewerkers	Afschermen d.m.v. een fysieke afscheiding of vhm stellen	Bij werkzaamheden nabij de bovenleiding veiligheidsdeskundige stellen
Opnemen spoorwegovergang	Binnen pvr	Pvr niet vrij binnen 180 sec.	Buitendienst/spanningloosstelling	Geen
Aarden werktuigen	Binnen pvr	Pvr vrij binnen 5 sec, zicht > 30 sec > 2 treinen per uur	Vhm stellen	Geen

3.2 Situatie ter plaatse

Ter hoogte van km 11.720 in de spoorlijn Breda - Tilburg (lijncode 123) zijn 2 sporen aanwezig.

Alle sporen zijn voorzien van bovenleiding.

De huidige baanvaksnelheid bedraagt 140 km/h.

Beide sporen zijn aan één zijde voorzien van profielvrije uitwijkplaats.

3.3 Werkplekbeveiligingsklasse

Het voorbouwen van de tunnel aan de zuidzijde van de spoorbaan geschiedt buiten het gebied 'PVR + 3 meter'.

Een deugdelijke afscherming van dit gebied met de werkplek is voldoende.

Voor het in de spoorbaan schuiven van de tunnel is een buitendienststelling gereserveerd.

Het afwerken van de spoorbaan na het inschuiven dient binnen een nader door de aannemer vast te stellen werkplekbeveiligingsklasse te geschieden.,

Het bouwen van de toeritten vindt plaats buiten het gebied van PVR + 3 meter. Een deugdelijke afscherming van dit gebied tijdens de bouwwerkzaamheden is toereikend.

3.4 Toegang tot de werkplek

De toegangen tot de werkterreinen zijn aangegeven op de bestekstekening 420/123/11.720/713 3362704 B-4.

3.5 Aan- en afvoer materialen

Idem als gestelde in punt 3.4.

4 Toetsing veiligheids- en gezondheidsplan door deskundige

Toetsing van het Veiligheids- en Gezondheidsplan (deel Ontwerpfase):			
Heeft toetsing plaatsgevonden:	Ja/Nee		
Toets uitgevoerd door:	Naam:	Datum:	Paraaf:

Bijlage 1 A V&G-dossier

1 Register

1.1 Register van relevante documenten

2 Inhoud V&G-dossier

2.1 Omschrijving van het bouwwerk

Onderdoorgang in Europalaan, lijncode 123, km 11.720, te Gilze Rijen en het opnemen van de nabijgelegen spoorwegovergang in de achterweg.

2.2 Technische specificaties

Bestek V40 BK 09450

2.3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

2.4 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie

3. Overdrachtsdocument

3.1 Overdracht van het V&G-dossier aan de directie van het werk

Bijlage 1 B Model actielijst bij onregelmatigheden

Actielijst bij onregelmatigheden op de werken (Ophangen in directie- en aannemerskeet!!)	
Bij stremming of dreigende stremming van het PVR:	Belangrijke instanties, namen van contactpersonen en hun telefoonnummers:
Altijd: • laat de treinen ophouden en bel de Centrale Meldkamer van de Spoorwegpolitie - Meld kort maar krachtig: • Plaatsnaam en/of baanvak en kilometrering; • De aard van het ongeval; • Beschrijf de plaats van het ongeval. • Probeer (indien mogelijk) verdere schade te voorkomen • Bij persoonlijk letsel: • vraag om geneeskundige hulp, e.e.a. in overleg met de op het werk aanwezige EHBO'er • Afhankelijk van de situatie: - Behandeling ter plaatse; - Patiënten vervoeren naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis; • Als de bovenleiding beschadigd is, pas na aarding het ongevalsterrein betreden • Waarschuw: - Regiodirecteur RIB, VAM, OL, projectleider, toezichthouder, uitvoerder, Arbo-coördinator en evt. wegbeheerder. Noteer zoveel mogelijk gegevens voor de later te geven persoonlijke verklaring, maak zo mogelijk foto's van het voorval. Waarschuw bij het vinden van explosieven: • Centrale Meldkamer Bedrijfsbeveiliging • Gemeente- of Rijkspolitie • Bouw- en woningtoezicht • Explosieven Opruimings Commando Breng iedereen op veilige afstand Bij storingen buiten werktijd contact op nemen met: schakel- en meldcentrale tel. (0) Bereikbaarheid van het werk: Plaatsnaam: Rijen Straatnaam: Europalaan Verdere kenmerken: Korte routebeschrijving:	Centrale Meldkamer te Utrecht(030) 235 44 44 Verkeersleiding (0) Schakel- en meldcentrale (SMC) *)..... (0) EHBO/arts **)..... (0) GG & GD **)..... (0) Politie en Brandweer **)..... 1-1-2 VAM Vakafdeling ir. J. van Pelt.....(030) 235 53 23 Projectleider ing. C.F. Vink.....(030) 235 89 58 privé (073) 511 31 16 Arbocoördinator uitvoeringsfase (0) Veiligheidskundige RIB (0) (030) 235 Mpg Bouwmanagement ing. G. van Roekel.....(030) 235 53 19 Directeur Arbeidsinspectie..... (0) Explosieven Opruimings Commando ***)(0345) 54 33 00 Wegbeheerder (0) Bouw- en woningtoezicht (0) Storingen PTT (0) Aboma(0318) 63 14 81 *) kan (in onderling overleg) door de VL worden gewaarschuwd. **) kan (in onderling overleg) door de Centrale meldkamer worden gewaarschuwd. ***) moet in principe door de plaatselijke burgemeester gewaarschuwd worden! (De opdrachtgever betaalt!)
Veilig werken betekent o.a.: Het bewust nemen van aanvaardbare risico's. Kortom: eerst denken, dan doen en overzien wat je doet!	
