


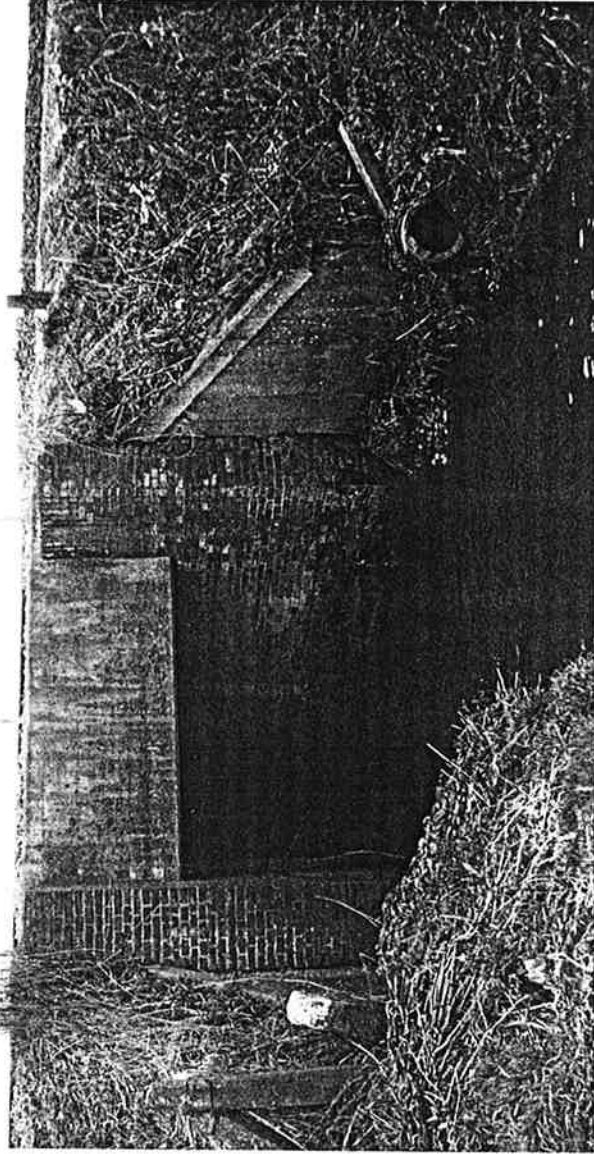

2. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, enz.)
Plaats van gew. beto. op landhoofden
v. metselwerk

E.O

3. Overspanningen / wijd: 156 m
4. Totale lengte: ± 290 m
5. Type opleggingen: —
6. Bouwjaar: 1886
7. Renovatie(s) in: 1960 / 1985

2

0

1

86

85

8. Algemene kwaliteit

- 1 goed
- 2 bruikbaar
- 3 ingrijpend herstel nodig
- 4 vernieuwing nodig
- 5 technisch verouderd

3

9. Draagkracht (op datum van de hoofdinspectie)

- 1 Volgens berekening en visuele inspectie geen bezwaar tegen belasting volgens VOSB 1963
- 2 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting D4 (4-assige wagens met aslasten van ten hoogste 225 kn en een tonmetergewicht van ten hoogste 8.0)
- 3 Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.
- 4 Visuele inspectie geeft op dit moment nog geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig.
- 5 Beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-assig worden nodig geoordeeld.

4

10. Gevaar voor aanrijden en aanvaren.


De draagkracht van de konstruktie kan aanzienlijk worden verminderd t.g.v.

- 1 aanrijden door treinen
- 2 aanrijden door autoverkeer
- 3 aanvaringen
- 4 Geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig.

11. Levensduur.

Nieuwbouw of herstel, ten laste van IPK, zal naar schatting nodig zijn :

- 1 niet binnen 40 jaar
- 2 niet binnen 10 jaar
- 3 binnen 10 jaar
- 4 op korte termijn

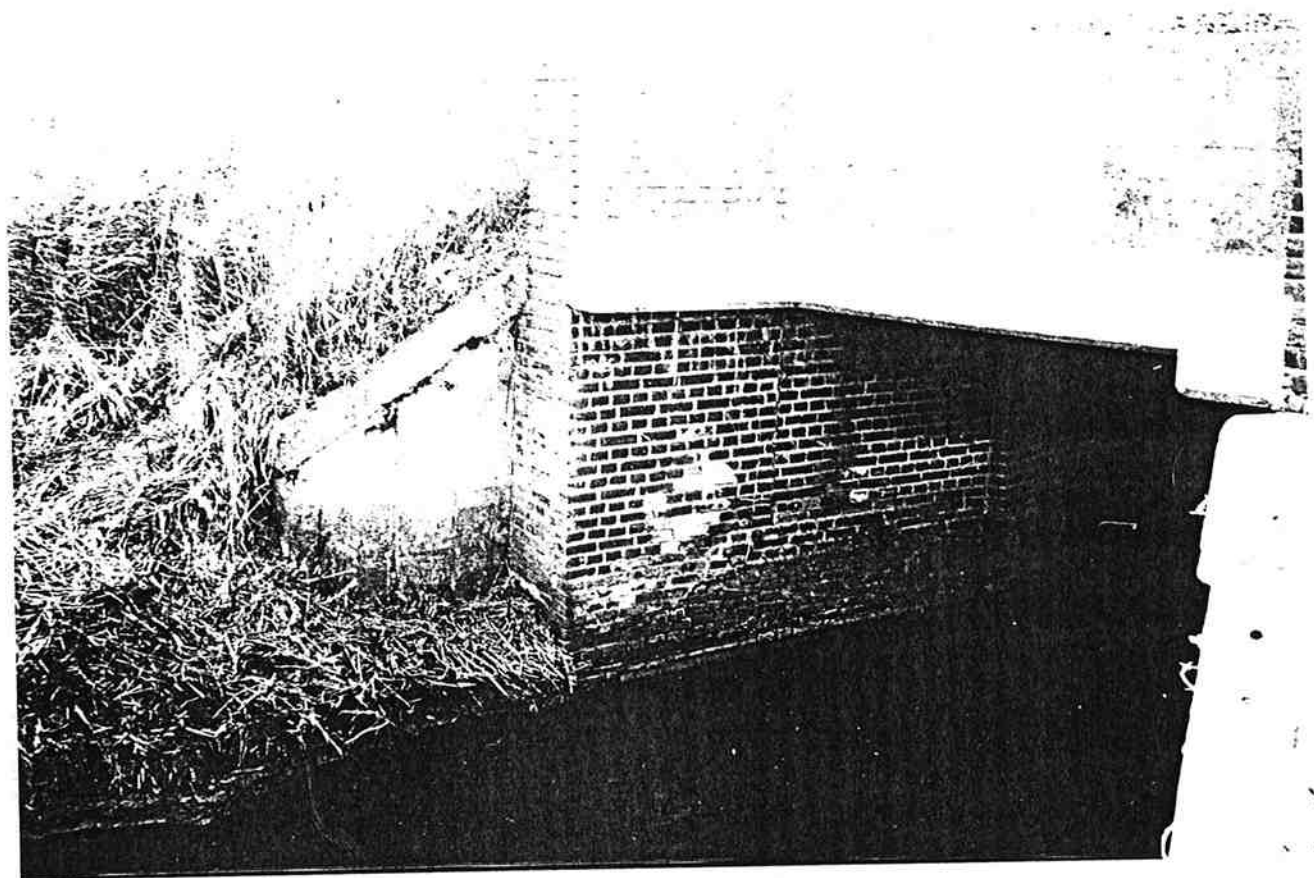

2

12. Kosten voor NS van de in punt 11 bedoelde nieuwbouw worden geschat op :

1 minder dan f 500.000,-

2 meer dan f 500.000,- maar minder dan f 2.500.000,-

3 meer dan f 2.500.000,-

4 nihil, de kosten komen ten laste van derden.

3

13. Persoonlijke veiligheid.

De afstand vanaf hart spoor tot de begrenzing van de vluchtruimte is :

1 < 2.50 m, gevaarlijk

4 lange perron

2 2.50 m 3.00 m

5 eenzijdig > 3.00 m

3 > 3.00 m

6 trogbrug

92

14. Volgende Dienstkering inspectie in 1992, 1995 enz.

01

15. Volgende hoofdinspectie in 1991 / ~~1992~~ nodig.

16. Overeenkomst.

1 geen, t.b.v. NS

2 overeenkomst met derden

3 vergunning

17. Ontwerper :

18. Aannemer :

2-W

19. Dienstkering : Zuid-West

RSJ

20. Sektie : Raanzondael

16

21. Lengte konstruktie L op spoor gemeten: 8,40 m ± 16.50 m

1

22. Spoorkonstruktie

1 spoor in ballast

3 blokken spoor

2 direct regelbaar

4

23. Diepte bk konstruktie t.o.v. BS.

1 < 0.70 m

4 > 1.00 m < 3.00 m

2 0.70 m

5 > 3.00 m

3 > 0.70 m

• In 1960 - duiken voorzien van een gew. betonplaat.

• In 1985 zijn de slengels aan de rechter zijde v.d. Spoorbaan op elkaar afgestempeld m.b.v. een in situ gestate betonsbalk. (Fa. Martens Rod)

• Metselwerk/voegwerk op de waterlijn vraagt aan dacht.

89

20. Hoofdinspectie uitgevoerd d.d. 17 feb 1989

namens Cdw:

Cob. Ing. W.v. Dijk

Slw. Th. v.d. Berg

namens Is 5.3 : Ing. H. J. G. G. G. G.

