

Project: Tilburg Onderdoorgang Campenhoef-Witbrand

Besteknummer: Tb 42/3/1

Bijlagebundel bij werkbesteding

voor het maken van een onderdoorgang, nabij km 16.32 in de
spoorlijn Breda-Tilburg, in de gemeente Tilburg

Opdrachtgever	:	NS Railinfrabeheer BV Nieuwbouwprojecten Zuid Postbus 6433 5600 HK Eindhoven
Adviseur en directie	:	ARCADIS Bouw/Infra BV Infrastructuur Berkenweg 7, Postbus 220 3800 AE Amersfoort telefoon 033 460 44 00 telefax 033 460 44 06
Uitgave	:	C
Status	:	goedgekeurd
Datum	:	6 januari 2000
Opgesteld	:	ing. A.H. Russcher
Gecontroleerd	:	ing. J.W.M. Hagen

REVISIE TOEGEPAST


ARCADIS BOUW/INFRA



Inhoud

Bijlage 02	Model Kennisgeving aan De Arbeidsinspectie
Bijlage 03	Model inschrijvingsbiljet
<u>Bijlage 04</u>	<u>Inschrijvingsstaat</u>
Bijlage 05	Model Bankgarantie
Bijlage 06	Verklaring van afstand van eigendom
Bijlage 07	Eigendomsverklaring
Bijlage 08	Model garantie voor een onderdeel
<u>Bijlage 09</u>	<u>Werkplanning</u>
<u>Bijlage 10</u>	<u>Model coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase</u>
Bijlage 11	Vrijwaringsverklaring
Bijlage 12	Model controleverklaring
Bijlage 13	Model akkoordverklaring
Bijlage 16	Grondbalans
Bijlage 17	Montage kopwapening voorgespannen palen
<u>Bijlage 19</u>	<u>Lijst van door Railinfra-beheer erkende bedrijven</u>
Bijlage 23	Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van vrijgegeven technische Specificaties
Bijlage 25	Overzicht bedrijven die beschikken over een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)

Toelichting op bijlagebundel bij het werkbestek

In de onderhavige bijlagebundel zijn de, in de navolgende nota's aangegeven, wijzigingen letterlijk opgenomen:

- Nota van inlichtingen van 12 november 1999;
- 2^e nota van inlichtingen van 17 november 1999;

In de bestekteksten zijn de wijzigingen voor iedere nota afzonderlijk in een "eigen" lettertype weergegeven, namelijk:

- Nota van inlichtingen:
- 2^e nota van inlichtingen:

Het werkbestek heeft geen enkele juridische status en is uitsluitende bedoeld als naslagwerk ten behoeve van de uitvoering.

Bijlage 02
Model Kennisgeving aan De Arbeidsinspectie

KENNISGEVING VAN HET VOorgenomen TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Omschrijving van het Bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

1.2 Adres en ligging van de bouwlocatie

Telefoon:

Fax:

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 *Opdrachtgever(s)*

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

2.2 *Ontwerpende partij(en)*

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

2.3 *Uitvoerende partij(en)*

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

2.4 *Coördinator(en) ontwerpfase*

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

2.5 *Coördinator(en) uitvoeringsfase*

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

3.1 Geplande bouwtijd: maanden

3.2 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening aannemer

Bijlage 03
Model Inschrijvingsbiljet

Behoort bij bestek Tb 42/3/1 voor het maken van een
onderdoorgang, nabij km 16.32 in de spoorlijn Breda-Tilburg, in
de gemeente Tilburg.

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te

B)

gevestigd te

C)

gevestigd te

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: f

(

gulden) n)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbe-
lasting bedraagt: f

(

gulden) n)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom is
die, bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalin-
gen (Standaard 1995).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbeste-
dingsreglement 1986 en met inachtneming van de bepalingen en ge-
gevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van in-
lichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 19

De inschrijver(s),

A (handtekening)

B (handtekening)

C

(handtekening)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
- 3) Inschrijvingssom in cijfers.
- 4) Inschrijvingssom in letters.
- 5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
- 6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
- 7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-

Bijlage 04
Inschrijvingsstaat

Aann. bedr. Ph. de Koning Jr
Bestek : TB42310
Tilburg o.d.g. Campenboef-Witbrant

Blz. 1

Bestek- post- nummer	Omschrijving	Sam- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens	
14	HULPWERK					
143	IN TE SCHUIVEN CONSTRUCTIE					
143010	Aanbrengen hulpconstructie.	pc	1 00	N	41400.00	41400.00
143020	Aanbrengen hulpconstructie.	pc	1 00	N	19850 00	19850 00
143030	Inschuiven moot.	sc	1.00	N	95375.00	95375.00
143040	Verwijderen hulpconstructie vlg postnr. 143010	sc	1.00	N	10040.00	10040.00
143050	Verwijderen hulpconstructie vlg postnr. 143020	sc	1.00	N	13335.00	13335.00
21	BEMALINGEN					
212	BRONBEMALINGEN					
2120	Moot 1 t/m 8					
212010	Aanbrengen bronbemaling.	gld	1.00	N	99500 00	99500 00
212020	Instandhouden bronbemaling.	gld	1 00	N	59850 00	59850.00
212030	Verwijderen bronbemaling	gld	1.00	N	9800.00	9800.00
213	BEMALING T.B.V. HULPWERKEN					
213010	Toepassen bemaling t.b.v. hulpwerk	gld	1 00	N	9500 00	9500.00
213020	Toepassen bemaling t b v pompput	gld	1.00	N	14500 00	14500.00
214	PEILBUIZEN EN DEBIETMEETPUNTEN					
214010	Monitoring grondwaterstand	st	5 00	V	500 00	2500.00
214020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	6 00	V	500 00	3000 00
214030	Monitoring grondwaterkwaliteit	gld	1.00	N	1000 00	1000 00
22	GRONDWERK					
221	ONTGRAVEN					
2210	Moot 1 t/m 3, geluidswal en geluidsscherm					
221010	Grond ontgraven uit cunet t b v moten 1 t/m 3.	m3	2261.00	N	2.89	6534.29
221020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	338.00	N	3.62	1223.56
221030	Grond ontgraven uit sleuf balk geluidsscherm	m3	5.00	N	28.93	144.65
221040	Grond ontgraven uit cunet schuifbaan moot 3	m3	135 00	N	5 79	781.65
221050	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	249 00	N	7 23	1800 27
221060	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	162 00	N	3 62	586 44
2211	Moot 4					
221110	Grond ontgraven uit spoorbaan	m3	1067 00	N	3 62	3862.54
221130	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	63 00	N	4.82	303.66
2212	Moot 5 t/m 8 en pompput.					
221210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	2782.00	N	2 89	8039 98
221220	Grond ontgraven uit put.	m3	290.00	N	3.62	1049.80
221230	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	288.00	N	7 23	2082 24
222	GRONDVERBETERINGEN					
2220	Moot 1 en 4					
222010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	400.00	N	1 44	576 00

Besteks post- nummer	Omschrijving	Ken- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
2221	Moot 5, 8 en pompput				
222110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	350.00	N 4.39	1536.50
223	AANVULLEN/OPHOGEN EN VERDICHTEN				
2230	Moot 1 t/m 4, geluidswal en geluidsscherm				
223010	Grond verwerken in aanvulling.	m3	640.00	N 10.75	6880.00
223020	Grond verwerken in aanvulling.	m3	25.00	N 40.34	1008.50
223030	Grond verwerken in aanvulling.	m3	35.00	N 38.42	1344.70
223040	Grond verwerken in bekleding.	m3	115.00	N 10.65	1224.75
2231	Moot 5 t/m 8 en pompput				
223110	Grond verwerken in aanvulling.	m3	1360.00	N 10.75	14620.00
223120	Grond verwerken in bekleding.	m3	123.00	N 13.25	1629.75
225	DEFINITIEF DEPOT				
2250	Grond uit moot 1 t/m 4.				
225010	Grond vervoeren en verwerken in definitief depot	m3	3106.00	N 8.86	27519.16
225020	Grond vervoeren en verwerken in definitief depot	m3	359.00	N 8.86	3180.74
2251	Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput				
225110	Grond vervoeren en verwerken in definitief depot.	m3	1712.00	N 8.86	15168.32
225120	Grond vervoeren en verwerken in definitief depot	m3	165.00	N 6.59	1087.35
226	TIJDELIJK DEPOT				
2260	Grond uit moot 1 t/m 4.				
226010	Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot	m3	700.00	N 6.73	4711.00
226020	Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot	m3	115.00	N 6.74	775.10
2261	Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput				
226110	Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot.	m3	1360.00	N 6.73	9152.80
226120	Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot	m3	123.00	N 6.74	829.02
2263	Inrichten tijdelijk depot				
226310	Inrichten tijdelijk depot	gld	1.00	N 5000.00	5000.00
23	DRAINAGE				
231	HORIZONTALE DRAINAGE				
2310	Drainage onder spoor				
231010	Aanbrengen drains onder stoorplaten	m	26.00	V 24.08	626.08
231020	Aanvullen sleuven.	m	26.00	V 47.36	1231.36
231030	Aanbrengen hulpstukken	st	4.00	V 168.46	673.84
231040	Aanbrengen hulpstukken	st	2.00	V 168.46	336.92
231050	Aanbrengen hulpstukken	st	2.00	V 141.13	282.26
231060	Aanbrengen HDPE-buis.	m	2.00	V 215.60	431.20
25	LEIDINGWERK				

Besteks- post- nummer	Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
25	KEMELWATERAFVOER/RIOLERING				
254110	Aanbrengen HDPE-buis.	m	44 00	V 120 70	5310 80
254120	Aanbrengen HDPE-buis	m	10 00	V 86 15	861 50
254130	Aanbrengen HDPE-hulpstuk	st	4 00	V 507 50	2030 00
254140	Aanbrengen HDPE-hulpstuk.	st	8 00	V 63 25	506 00
254150	Aanbrengen HDPE-hulpstuk	st	4 00	V 122 88	491 52
254210	Aanbrengen put van glasvezelversterkt polyester	st	4 00	A 1315 50	5262 00
254220	Aanbrengen putrand met deksel	st	4 00	A 503 16	2012 64
254310	Aanbrengen betonbuis -mof-apie eind-	m	12 00	V 170 17	2042 04
254410	Aanbrengen HDPE-buis.	m	16 00	V 72 35	1157 60
26	KABELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
2610	Kabels en leidingen NS				
261010	Uitvoeren deelbestek	gld	1 00	N 26000 00	26000 00
261020	Toepassen tijdelijke leidingbrug	st	2 00	N 2520 00	5040 00
2620	Kabels en leidingen nutsbedrijven				
262010	Aanbrengen PVC-buis.	m	636 00	A 18 78	11944 08
262020	Aanbrengen PVC-buis.	m	212 00	A 57 81	12255 72
262030	Aanbrengen PVC-buis.	m	34 00	A 57 81	1965 54
262040	Aanbrengen PVC-buis	m	34 00	A 66 05	2245 70
31	WEGVERHARDINGEN				
315	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS				
315010	verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	172 00	A 1 34	230 68
315020	Aanbrengen laag zandcement	m2	65 00	A 17 21	1118 65
315030	Leveren cement voor zandcementmengsel	ton	> 25	V 300 00	1575 00
315110	verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	172 00	A 1 34	230 68
315120	Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel.	m2	172 00	A 40 12	6900 64
36	GELUIDSBEPERKENDE CONSTRUCTIES				
361	STIJLEN EN TOEBEHOREN				
361010	Aanbrengen stalen stijl.	st	16 00	A 606 41	9702 50
361020	Aanbrengen stalen stijl.	st	4 00	A 162 03	648 10
361030	Aanbrengen stalen stijl	st	2 00	A 227 80	455 60
361110	Onderaapelen voetplaat inclusief afwerken ankers	st	22 00	A 73 85	1624 60
363	TRANSPARANTSCHERMEN				
363010	Aanbrengen beglazingsprofielen.	st	36 00	A 262 22	9440 00
363020	Aanbrengen stalen klemregel	st	17 00	A 190 29	3235 00
363030	Aanbrengen stalen klemregel	st	2 00	A 158 75	317 50
363040	Aanbrengen stalen onderregel.	st	17 00	A 212 94	3620 00
363050	Aanbrengen stalen onderregel.	st	2 00	A 237 50	475 00
363060	Aanbrengen beglazingsprofielen.	st	2 00	A 217 00	434 00
363110	Aanbrengen reflecterend element van gelamin. glas.	st	17 00	A 1578 32	26831 50
363120	Aanbrengen reflecterend element van gelamin glas.	st	2 00	A 1519 25	3038 50
39	OPLEGGINGEN EN VOEGCONSTRUCTIES				
391	OPLEGGINGEN, ALGEMEEN				
391010	Aanbrengen opleggingen	st	4 00	A 252 80	1011 20

Bestek- post- nummer	Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
391020	Aanbrengen opleggingen	st	30.00	A 277.80	8334.00
393	VOEGCONSTRUCTIES EN VOEGVULLINGEN				
393010	Aanbrengen voegvulling polystyreen	m	95.00	A 11.50	1092.50
393020	Aanbrengen in te betonneren voegstrip.	m	121.00	A 66.25	8016.25
393040	Aanbrengen voegvulling overgangsplaten	m2	4.00	A 59.06	236.25
393050	Aanbrengen voegprofiel type Migwa FB20	m	33.00	V 66.25	2186.25
393060	Aanbrengen voegprofiel type Schrimp 65	m	38.00	V 86.40	3283.20
393070	Aanbrengen voegprofiel type Omega 8240-60	m	5.00	A 1055.00	5275.00
393080	Aanbrengen voegprofiel type Omega 8240-60	m	33.00	A 1055.00	34815.00
393090	Aanbrengen voegvulling kunststofschuim	m	35.00	A 24.50	857.50
41	PONDERINGSTECHIEKEN				
411	DAMWANDEN				
411020	Aanbrengen grondkering.	st	1.00	A 12820.00	12820.00
411110	Verwijderen stalen damwand	st	1.00	A 3290.00	3290.00
41210	Toepassen bouwkuip pompput	glc	1.00	N 750.00	750.00
413	PREFAB BETONPALEN				
413010	Heien palen van voorgespannen beton.	st	4.00	A 549.25	2197.00
413020	Heien betonnen palen.	st	14.00	A 391.00	5474.00
413030	Heien betonnen palen.	st	12.00	A 523.00	6276.00
413040	Heien betonnen palen	st	16.00	A 496.75	7948.00
413050	Heien betonnen palen	st	6.00	A 474.50	2847.00
413510	Verwijderen betonnen paalkoppen	st	52.00	A 80.00	4160.00
413520	Ombuigen stekken paalkopwepening	st	316.00	A 14.50	4582.00
42	BETONWERK				
421	BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES				
4210	Voorgespannen dek				
421010	Toepassen bekisting t.b.v. een vloerv. onderdeel	m2	200.00	A 112.25	22450.00
421030	Aanbrengen ondersteuningsconstructie bekisting.	m2	200.00	A 112.40	22400.00
421040	Verwijderen ondersteuningsconstructie bekisting.	m2	200.00	A 45.00	9000.00
421050	Toepassen randbekisting	m2	16.10	A 177.25	2853.73
421060	Toepassen bekisting afspanvlak.	m2	22.60	A 209.75	4740.35
421070	Toepassen bekisting goot	m1	25.80	A 79.10	2040.78
421080	Toepassen bekisting aanstorting	m2	67.00	A 157.75	10569.25
421090	Toepassen bekisting wand.	m2	165.00	A 162.75	26853.75
421110	Aanbrengen mal Jaartal met NS-vignet.	st	2.00	A 562.50	1125.00
421120	Aanbrengen verloren bekisting	m2	24.30	A 96.75	2351.03
421130	Toepassen bekisting krimpvoegen	m2	8.00	A 129.25	1034.00
4212	Moot 1 t/m3				
421210	Toepassen randbekisting	m2	50.00	A 150.25	7512.50
421220	Toepassen randbekisting	m2	40.00	A 149.25	4477.50
421230	Toepassen randbekisting.	m2	10.00	A 168.75	1687.50
421240	Toepassen bekisting inkassing	st	3.00	A 284.83	854.50
421250	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel	m2	235.00	A 139.75	32841.25
421260	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel.	m2	105.00	A 128.25	13466.25
421270	Toepassen randbekisting.	m2	6.00	A 227.25	1363.50
4214	Moot 4				

Bestek- post- nummer	Omschrijving	Een- heid	hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
421410	Toepassen randbekisting	m2	30.00	A 159.25	4777.50
421420	Toepassen randbekisting	m2	15.00	A 149.25	2238.75
421440	Toepassen bekisting inkassing	st	1.00	A 299.08	299.08
421450	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel	m2	180.00	A 172.25	31005.00
421460	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel	m2	45.00	A 133.25	5996.25
421470	Toepassen randbekisting	m2	6.00	A 227.25	1363.50
4215	Moort 5 t/m 8				
421510	Toepassen randbekisting	m2	40.00	A 156.75	6270.00
421520	Toepassen randbekisting	m2	30.00	A 149.25	4477.50
421530	Toepassen randbekisting	m2	10.00	A 168.75	1687.50
421540	Toepassen bekisting inkassing	st	4.00	A 244.52	978.08
421550	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel	m2	355.00	A 139.75	49611.25
421560	Toepassen t.b.v. een bekisting wandv. onderdeel	m2	130.00	A 128.25	16672.50
421570	Toepassen randbekisting	m2	6.00	A 227.25	1363.50
421590	Toepassen bekisting inkassing	st	1.00	A 431.78	431.78
4216	Geluidsscherm				
421610	Toepassen randbekisting	m2	108.00	A 159.25	17199.00
422	BETONSTAAL EN VOORSPANNING				
4220	BETONSTAAL				
422010	Aanbrengen betonstaal kernmiddeellijn ≤ 12 mm, FeB500	ton	22.00	V 2112.84	46482.50
422020	Aanbrengen betonstaal kernmiddeellijn 16-20mm, FeB500	ton	110.00	V 1600.53	176058.00
422030	Aanbrengen hulpstaal voor wapening	kg	6500.00	V 2.99	19448.52
4221	VOORSPANNING				
422110	Aanbrengen van de voorspannelementen	st	30.00	A 933.33	28000.00
422120	Spannen, injecteren en afwerken voorspannelementen	st	30.00	A 1666.67	50000.00
424	GRINDBETON				
4240	Dekplaat				
424010	Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel	m3	136.00	A 250.21	34028.96
424020	Aanbrengen beton opstorting	m3	15.20	A 270.93	4118.17
424030	Aanbrengen beton wand	m3	27.10	A 289.92	7856.86
4241	Moort 1 t/m 3				
424110	Aanbrengen werkvloer	m3	512.00	A 31.91	16336.10
424120	Aanbrengen beton vloer	m3	231.00	A 214.15	49469.70
424130	Aanbrengen beton wand	m3	63.00	A 272.63	17175.81
424140	Aanbrengen stampbeton	m3	62.20	A 266.93	16603.00
4242	Moort 4				
424220	Aanbrengen beton vloer	m3	191.00	A 240.14	45866.20
424230	Aanbrengen beton wand	m3	52.00	A 259.73	13505.84
424240	Aanbrengen stampbeton	m3	28.70	A 267.05	7664.25
424250	Aanbrengen beton wand	m3	4.00	A 938.75	3755.00
424270	Aanbrengen schuimbeton	m3	10.30	A 567.86	5849.00
4243	Moort 5 t/m 8				
424310	Aanbrengen werkvloer	m2	659.00	A 35.58	23444.96

Besteks post- nummer	Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
42410	Aanbrengen beton vloer	m3	356.00	A 234.69	83548.80
42430	Aanbrengen beton wand	m3	100.10	A 272.60	27287.49
42440	Aanbrengen stampbeton	m3	81.10	A 266.79	21636.75
424	Geluidsscherm				
42410	Aanbrengen werkvloer	m2	18.00	A 217.99	3923.77
42420	Aanbrengen beton ligger	m3	19.00	A 272.85	5184.24
426	GEPEKFACTUREERD STON				
426010	Aanbrengen voetpadplaat	st	118.00	A 107.97	12699.00
426020	Aanbrengen overgangsplaten dekplaat	st	18.00	A 1248.89	22480.00
426030	Aanbrengen overgangsplaten, kabelkokers	st	4.00	A 894.38	3577.50
426040	Aanbrengen overgangsplaten; mantelbuizen	st	4.00	A 489.38	1957.50
426050	Aanbrengen overgangsplaten; fietspad	st	14.00	A 557.50	7805.00
427	IN TE STORTEN/BOREN ONDERDELEN				
4270	Dekplaat moor 4				
427010	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	4.00	V 760.00	3040.00
427020	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	5.40	A 80.00	432.00
427030	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	27.50	A 51.23	1408.75
427040	Aanbrengen in te betonneren ankers	st	48.00	A 68.75	3300.00
427050	Aanbrengen in te betonneren ankers	st	76.00	A 68.75	5225.00
427060	Boren van gaten in beton	st	40.00	A 17.50	700.00
427070	Aanbrengen ankers M8 in gedompte gaten	st	40.00	A 46.25	1850.00
427080	Toepassen injectiealangen	m	35.00	V 105.00	3675.00
4271	Moor 1 t/m 3				
427110	Aanbrengen in te betonneren deuvels	st	7.00	A 24.50	171.50
427120	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	44.00	A 91.05	4006.40
427130	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	18.00	A 456.08	8209.50
427140	Aanbrengen putrand met deksel	st	1.00	A 241.50	241.50
427170	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	2.00	A 1472.50	2945.00
427180	Aanbrengen in te betonneren draingoot	st	74.00	A 285.90	21156.60
427190	Aanbrengen in te betonneren draingoot passtuk	st	4.00	A 306.90	1227.60
4272	Moor 4				
427210	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	17.00	A 86.19	1465.20
427220	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	9.00	A 372.15	3354.75
427230	Aanbrengen putrand met deksel	st	1.00	A 474.00	474.00
427240	Aanbrengen in te betonneren draingoot	st	32.00	A 285.90	9148.80
427250	Aanbrengen in te betonneren draingoot, passtuk	st	2.00	A 306.90	613.80
427260	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	105.00	A 41.70	4378.50
427270	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	35.00	A 79.75	2791.25
427280	Aanbrengen in te betonneren stekankers	st	392.00	A 27.75	10878.00
427290	Aanbrengen in te betonneren stekelinden	st	392.00	A 27.75	10878.00
427300	Aanbrengen in te betonneren rondgaande strip	st	14.00	A 378.75	5302.50
427310	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	1.00	A 998.50	998.50
427320	Toepassen injectiealangen	m	60.00	A 41.00	2460.00
4274	Moor 5 t/m 8				
427410	Aanbrengen in te betonneren deuvels	st	7.00	A 24.50	171.50
427420	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	55.00	A 93.42	5138.00
427430	Aanbrengen in te betonneren betonnen buis	m	7.60	V 262.37	1994.00
427440	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	27.00	A 372.75	10064.25

Bestek- post- nummer	Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
427450	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4.00	A 474.00	1896.00
427460	Aanbrengen in te betonneren gratingoot	st	96.00	A 285.90	27446.40
427470	Aanbrengen in te betonneren gratingoot, passtuk	st	4.00	A 306.90	1227.60
427480	Aanbrengen putrand met deksel	st	1.00	A 1510.00	1510.00
427490	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis	m	66.00	A 41.68	2751.00
427500	Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.	m	22.00	N 75.93	1670.50
427510	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	56.00	A 68.75	3850.00
427520	Aanbrengen in te betonneren HDPE-buis	m	2.00	A 281.00	562.00
4276	Geluidsscherm aan oost- en westzijde onderdoorgang				
427610	Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	64.00	A 68.75	4400.00
427620	Boren van gaten in beton	st	108.00	A 17.50	1890.00
427630	Aanbrengen ankers M8 in gepoorde gaten.	st	108.00	A 11.75	1269.00
428	BESCHERMEN EN BEWERKEN BETONOPPERVLAKKEN				
428010	Bewerken van verharde betonoppervlakken: stralen.	m2	135.00	A 30.00	4050.00
428110	Aanbrengen anti-graffitycoating	m2	380.00	V 17.50	6650.00
428240	Aanbrengen waterdichte laag; hydrofoberingsmiddel	m2	1020.00	A 13.00	13260.00
43	STAALCONSTRUCTIES				
431	LEUNINGEN EN HEKWERKEN				
431010	Aanbrengen hekwerk	st	1.00	A 3952.75	3952.75
431020	Aanbrengen hekwerk	st	2.00	A 3642.13	7284.25
431030	Aanbrengen hekwerk	st	1.00	A 6015.25	6015.25
431310	Ongeersabelen voetplaat inclusief afwerken ankers	st	33.00	A 81.07	2675.40
432	AANRIJDIJZERS				
432010	Aanbrengen aanrijdijzer	m	22.40	A 240.80	5394.00
433	ROOSTERS				
433010	Aanbrengen Stabag-rooster.	st	4.00	A 2130.00	8520.00
45	NETSELWERK				
451010	Maken scheidingwandje kabelgoten	m1	26.20	A 87.14	2283.10
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN				
4701	POMPPUT				
470110	Pompput	st	1.00	A 34183.00	34183.00
49	BOUWKUNDIGE AFWERKING				
493	PLAFONDS				
493010	Aanbrengen spuitpleister	m2	161.00	A 87.00	14007.00
50	SPOORTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
501010	Vervoeren deelpastek	glg	1.00	N 127005.00	127005.00
501020	Onderhouden spoor	glg	1.00	N 10000.00	10000.00
51	GROENVORZIENINGEN				

Bestek post- nummer	Omschrijving	Ken- heid	Hoofdelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
511	INZAATEN				
511010	Zaaien caluas.	arc	36.00	V 27 04	973 44
52	TALUDEBEKLEDING				
521	ONDERDOORGANG				
521110	Aanbrengen taludafwerking	m2	334 00	A 95 49	31895.00
522	WATERGANGEN				
522110	Aanbrengen taludafwerking.	m2	6 00	A 118 00	708 00
56	CONSERVERINGSWERKEN				
562	STAAL				
62020	Industrieel schilderen hekwerk.	gld	1 00	N 2476 00	2476.00
62030	Industrieel schilderen onderdelen geluidsscherm.	gld	1 00	N 3651.75	3651 75
61	WERK VAN ALOSHEWE AARD				
617	BIJKOMENDE ACTIVITEITEN				
617020	Uitvoeren en instandhouden uitzetwerk	gld	1.00	N 2517 50	2517 50
617030	Controlemetingen spoor	gld	1.00	N 5177.00	5177 00
631	AFRASTERINGEN				
631010	Aanbrengen afrastering	m	10.00	V 226.00	2260 00
65	BEREKENINGEN EN TEKENINGEN				
650010	Reken- en tekenwerk bekisting	gld	1 00	N 6000.00	6000.00
650030	Vervaardigen tekeningen en berekeningen	gld	1 00	N 1000.00	1000 00
650050	Vervaardigen tekeningen en berekeningen schuiven	gld	1.00	N 15000.00	15000.00
650070	Vervaardigen werktekeningen hekwerken	gld	1 00	N 500.00	500.00
650080	Vervaardigen tekeningen en berek. prefabbetonond.	gld	1 00	N 500 00	500.00
650090	Vervaardigen werktekeningen geluidsscherm	gld	1 00	N 1000 00	1000.00
650110	vervaardigen buigstaten	gld	1.00	N 2500.00	2500 00
650120	Reken- en tekenwerk leidingbrug	gld	1.00	N 1000.00	1000 00
650140	Reken en tekenwerk grondkering	gld	1.00	N 1500.00	1500 00
650150	Reken en tekenwerk grondkering	gld	1.00	N 1500.00	1500 00
650160	Bemalingsplan	gld	1 00	N 5000.00	5000 00
650170	Reken- en tekenwerk pompkuip pompput	gld	1 00	N 4000.00	4000.00
650180	Bemalingsplan pompkuip pompput	gld	1 00	N 5000.00	5000 00
71	ELECTROTECHNISCHE EN WERKT. B.K. WERKT. K.				
711010	Uitvoeren deelbestek	gld	1.00	N 57765 00	57765.00
75	BOUWPLAATSVORZIENINGEN				
751	WERKTEREIN EN TOEGANGEN				
751010	Aanbrengen en onderhouden afrastering	gld	1 00	N 9187.50	9187 50
751020	verwijderen afrastering.	gld	1.00	N 6562.50	6562 50
751050	Toepassen verkeersmaatregelen	gld	1 00	N 10000 00	10000.00
752	TIJDELIJKE AFSCHEIDINGEN, RECLAME-/INFORMATIEBORD				

Besteks post- nummer	Omschrijving	Ken- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
752030	Aanbrengen reclamebord.	st	1.00	A 2040.00	2040.00
752040	Verwijderen reclamebord.	st	1.00	A 650.00	650.00
752050	Aanbrengen informatiebord.	st	1.00	A 2040.00	2040.00
752060	Verwijderen informatiebord.	st	1.00	A 650.00	650.00
753	DIRECTIEBEHOEFEN				
753010	Gebruik keet.	gld	1.00	N 59240.00	59240.00
753030	Inventaris directieverblijf.	gld	1.00	A 4500.00	4500.00
753050	T b a acnaff- en tekenbenodigheden.	gld	1.00	A 3000.00	3000.00
753060	Gebruik van instrumenten.	gld	1.00	A 2060.00	2060.00
753070	Gebruik veiligheidsmiddelen.	gld	1.00	A 2000.00	2000.00
754	BEWAKING / BEVEILIGING				
754010	Alarminstallatie directieverblijf.	gld	1.00	N 2020.00	2020.00
800	VEILIGHEID EN MILIEU				
801	VEILIGHEID ALGEMEEN				
801010	Verrichten veiligheidsbezoeken.	gld	1.00	N 6000.00	6000.00
801020	Coördinatie uitvoering Arpopesluit.	gld	1.00	N 17500.00	17500.00
801030	Opstellen RVN-plan	gld	1.00	N 7500.00	7500.00
802	MOBIELE WERKTUIGEN, HIJSKRANEN, POMPEN, GRUBBINGSMACHINES				
802010	Verrichten keuringen	gld	1.00	N 18200.00	18200.00
802020	Aarding mobiele werktuigen	gld	1.00	N 3000.00	3000.00
803	SPOORWEGVEILIGHEID				
803010	Aanbrengen afzetting spoorbaan.	m	40.00	V 25.50	1020.00
803020	Verwijderen afzetting spoorbaan	m	40.00	V 13.00	520.00
804	INZET VEILIGHEIDSFUNCTIONARISSEN				
804010	Inzet leider werkplekbeveiliging (LWB), normaal.	uur	20.00	V 89.10	1782.00
804030	Inzet leider werkplekbeveiliging (LWB), weekend.	uur	160.00	V 128.70	20592.00
804040	Inzet veiligheidsman (VHM), normaal	uur	40.00	V 81.25	3250.00
804060	Inzet veiligheidsman (VHM), weekend	uur	180.00	V 181.95	32751.00
804110	Inzet Bevoegd persoon, normaal.	uur	20.00	V 81.00	1620.00
804130	Inzet Bevoegd persoon, weekend.	uur	100.00	V 195.00	19500.00
804140	Inzet Ploegleider, normaal.	uur	20.00	V 81.00	1620.00
804160	Inzet Ploegleider, weekend	uur	100.00	V 195.00	19500.00
805	INZET VEILIGHEIDSMIDDELEN				
805020	Aanbrengen en verwijderen zelfsign kortsluitlans.	st	60.00	V 50.00	3000.00
805030	Aanbrengen en verwijderen aardroer	st	50.00	V 250.00	12500.00
806	TIJDELIJKE Snelheidsbeperking				
806110	Aanbrengen LAR-borden	st	12.00	A 260.00	3120.00
806120	Onderhouden LAR-borden	gld	1.00	A 16300.00	16300.00
806130	Verwijderen LAR-borden	st	12.00	A 200.00	2400.00
806210	Aanbrengen snelheidsbord	st	4.00	A 20.00	80.00
806220	Onderhouden snelheidsbord	gld	1.00	A 230.00	230.00
806230	Verwijderen snelheidsbord.	st	4.00	A 15.25	61.00
806340	Aanbrengen snelheidsbord.	st	4.00	A 20.00	80.00

Besteks post- nummer	Omschrijving	Een- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in gulden	Totaal bedrag in gulden
806320	Onderhouden snelheidsbord	gld	1 00	A 230 00	230 00
806330	verwijderen snelheidsbord.	st	1 00	A 15 25	61 00
806410	Aanvragen tijdelijke snelheidsbeperkingen.	gld	1 00	A 1560 00	1560 00
9	STAARTPOSTEN				
	SUBTOTAAL				2711509.11

Besteks post- nummer	Omschrijving	Ben- heid	Hoeveelheid resultaats- verplichting	Prijs per eenheid in guldens	Totaal bedrag in guldens
	TRANSPORT SUBTOTAAL				2711509.11
91	EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:				
910010	Inrichten werkterrein			165013.75	
910020	Opruimen werkterrein			18128.75	
910030	Transportkosten			15410.00	
910050	Aankoop risicoregeling			20000.00	
918880	Overige eenmalige kosten			87815.00	
919990	Totaal eenmalige kosten	gld		N	306367.50
929990	Uitvoeringskosten	gld	1.00	N 395019.00	395019.00
939990	Algemene kosten	gld	1.00	N 271245.63	271245.63
949990	Winst en risico	gld	1.00	N 170858.79	170858.79
95	STELPOST				
950030	Stelpost fotografische vastlegging	gld	15000.00	V 1.00	15000.00
950040	Stelpost trillingsmetingen	gld	20000.00	V 1.00	20000.00
950050	T.b.s. werknemer	gld	10000.00	V 1.00	10000.00
	Aannemingsom. de omzetbelasting niet inbegrepen				3900000.03

De aannemer.

Ph. de Koning Jr
Postbus 25
3350 AA Papendrecht

20 december 1999

Bijlage 05
Model bankgarantie

Model Bankgarantie niet getrapt (onderhoudsperiode t/m 6 maanden)

model
BANKGARANTIE

De ondergetekende:

gevestigd te:
hierna te noemen "de bank",

stelt zich hierbij onherroepelijk garant tegenover:

NS Railinfrabeheer BV, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "RIB",

tot een bedrag van maximaal: fl
(zegge: gulden).

voor de juiste en volledige nakoming door:

.....
gevestigd te:
hierna te noemen "de aannemer",

van de verplichtingen, welke voor hem jegens RIB voortvloeien uit opdrachtnummer:
d.d.: 19 . . met kenmerk:
betreffende:

De bank verbindt zich op grond van deze garantie ten hoogste bovengenoemd bedrag op eerste schriftelijke verzoek en zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking aan RIB te voldoen, indien naar de mening van RIB de aannemer in gebreke is.

Deze garantie eindigt op de dag van het verstrijken van de onderhoudstermijn van voornoemd werk, nadat het werk door of vanwege RIB andermaal is opgenomen en goedgekeurd.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

te

d.d.

Bijlage 06
Verklaring van afstand van eigendom

Behoort bij besteknr.

MODEL B

VERKLARING VAN AFSTAND VAN EIGENDOM

van voor het werk bestemde bouwstoffen [als bedoeld in § 19, lid 1 van de UAV 1989]

De ondergetekende:
gevestigd te:

ten deze genoegzaam vertegenwoordigd door:

in aanmerking nemende:

- dat NS Railinfrabeheer BV (RIB), gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "de opdrachtgever",
aan:
gevestigd te:
hierna te noemen "de aannemer" heeft opgedragen:

.....
.....
.....
op welke overeenkomst de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) van toepassing zijn;

- dat de aannemer voornemens is daarin de in onderstaande Lijst van Bouwstoffen vermelde bouwstoffen te verwerken;

verklaart hierbij, in zijn hoedanigheid als leverancier voor de aannemer, het volgende:

De ondergetekende doet afstand van alle aanspraken op bedoelde bouwstoffen en beschouwt deze na goedkeuring als eigendom van de opdrachtgever ingevolge § 19, lid 1 van de UAV 1989 voormeld.

Lijst van Bouwstoffen

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Aldus opgemaakt en ondertekend,
te
d.d.
de leverancier

Model RIB AKI 0016

Bijlage 07
Eigendomsverklaring

Behoort bij besteknr.

MODEL C
EIGENDOMSVERKLARING

van voor het werk bestemde bouwstoffen [in aanvulling op § 19, lid 1 van de UAV 1989]

De ondergetekende:
gevestigd te:
hierna te noemen "de aannemer",

ten deze genoegzaam vertegenwoordigd door:

in aanmerking nemende:

- dat NS Railinfrabeheer BV (RIB), gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "de opdrachtgever", aan de aannemer heeft opgedragen:

.....
.....
.....

op welke overeenkomst de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) van toepassing zijn;

- dat uit voornoemde opdracht voortvloeiende bewerkingen van bouwstoffen geschieden op locatie van:

.....

verklaart hierbij het volgende:

1. De aannemer erkent dat de in considerans bedoelde bouwstoffen in iedere staat van bewerking eigendom van de opdrachtgever blijven. De aannemer zal zich niet op eigendomsverkrijging door zaaksvorming beroepen.
2. Ten blijk van de identiteit van de in de considerans bedoelde bouwstoffen kunnen van belang zijn: aangebrachte letters "RIB", samenstelling of aard van de bewerking, eventuele gietingsnummers, documenten etc., danwel vastlegging in onderstaande Lijst van Bouwstoffen.

Lijst van Bouwstoffen

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Aldus opgemaakt en ondertekend (in tweevoud),
te
d.d.
de aannemer

Model RIB AKI 0017

Bijlage 08
Model garantie voor een onderdeel

MODEL GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

Terzake van het bestek voor:.....1)

gelegen te:2)

volgens bestek3)

opgedragen aan4)

Beschrijving van het onderdeel van het werk waarvoor de garantie geldt:

De garantie heeft betrekking op de volgende facetten:

Ondergetekende:5)

gevestigd te6)

hierna te noemen de "Garant" en diens rechtopvolgers, aan wie de bepalingen in hiervoor genoemd bestek/overeenkomst bekend zijn, verklaart hiermee ten overstaan van:

NS Railinfrabeheer B.V. gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de "Opdrachtgever" en diens rechtsopvolgers, dat hij de gebreken, die vanaf het gereedkomen van het bovenbeschreven onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een periode van 7) jaren, aan dit onderdeel mochten voorkomen op eerste aanzegging van de Opdrachtgever of diens rechtsopvolgers onverwijld en voor zijn rekening zal herstellen.

De Garant:9)


Toelichting:

- 1) korte omschrijving van het werk
- 2) adres van het werk
- 3) nummer van het bestek of van de overeenkomst
- 4) naam van de aannemer volgens inschrijving bij de K.v.K.
- 5) naam van de aannemer volgens inschrijving bij de K.v.K.
- 6) adres van de aannemer volgens inschrijving bij de K.v.K.
- 7) de in het bestek genoemde garantietermijn in cijfers en letters
- 8) plaats en datum van de ondertekening
- 9) handtekening van de garant, met naam en voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

Bijlage 09
Werkplanning

Onderdoorgang Campenhoef - Witbrant

Uitvoeringsplanning

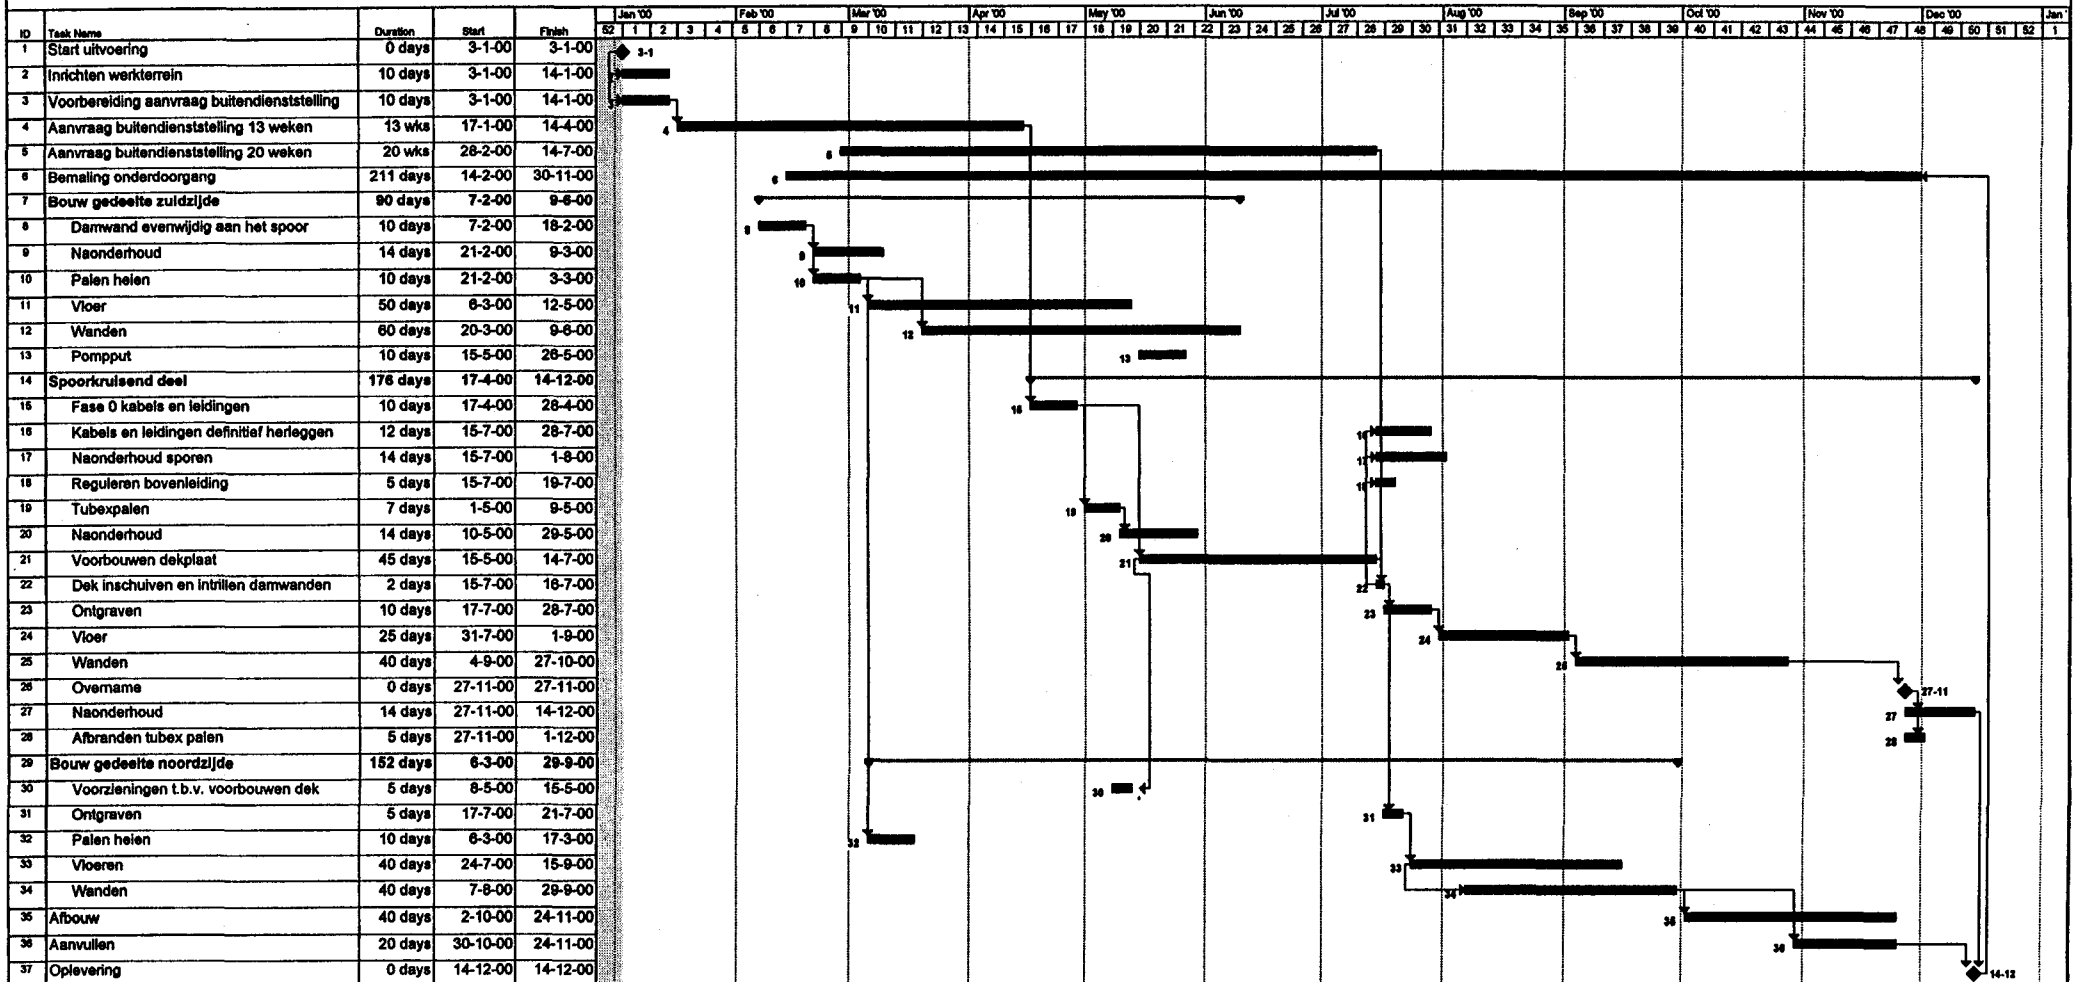

Bijlage 10
Model coördinatie overeenkomst uitvoeringsfase

MODEL COÖRDINATIE-OVEREENKOMST UITVOERINGSFASE

(Dit model is gebaseerd op een project met een aannemer en nevenaannemers, waarbij gezien de aard van de werkzaamheden de nevenaannemers ook als onderaannemer van de coördinerende aannemer zouden kunnen werken).

Coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase

DE ONDERGETEKENDEN

1. De opdrachtgever, NS Railinfrabeheer B.V. gevestigd te Utrecht
2. De,
3. De,
4. De,
5. De,

en de na overleg met de bij het project betrokken partijen gedurende de uitvoeringsfase nog toe te treden partij(-en).

IN AANMERKING NEMENDE

- a. dat de opdrachtgever ten aanzien van de uitvoeringsfase van het project "....." (korte omschrijving en adres van het werk), hierna te noemen het Project, aan bovengenoemde partijen (Deel)opdrachten heeft verstrekt of te zijner tijd gaat verstrekken;
- b. dat de opdrachtgever een optimale vorm van samenwerking tussen de bij het Project betrokken partijen wenst;
- c. dat de partijen zich deswege jegens elkaar verbinden tot samenwerking en derhalve;

VERKLAREN BEREID TE ZIJN SAMEN TE WERKEN CONFORM DE HIERNAVOLGENDE BEPALINGEN

PARAGRAAF 1: DEFINITIES

In deze Coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase worden verstaan onder:

Partijen : De in de considerans genoemde partijen.

Coördinerend aannemer : De aannemer, belast met de uitvoeringscoördinatie.

Aannemerscoördinator : De vertegenwoordiger van de Coördinerend aannemer, belast met de dagelijkse leiding over de coördinatie der werkzaamheden.

Uitvoeringsplanning : De door de Aannemerscoördinator opgestelde en in de Bouwvergadering goedgekeurde planning, welke na goedkeuring bindend is.

- Bouwvergadering : Het overleg, onder voorzitterschap van de directie over de uitvoering, gesignaleerde knelpunten en de oplossingen daarvan in de uitvoeringsfase, alsmede de bewaking van de voortgang van het uitvoeringsproces.
- Werkvergadering : Het overleg, onder voorzitterschap van de Aannemerscoördinator, tijdens de uitvoering over het afstemmen van de diverse disciplines op elkaar alsmede de bewaking van de dagelijkse voortgang.

PARAGRAAF 2: TAKEN EN VERPLICHTINGEN

De taken en verplichtingen zijn:

- a. Alle partijen zullen over en weer volledig medewerking verlenen aan de uitvoeringsfase van het Project, met als uitgangspunt een zo optimaal mogelijke onderlinge afstemming van de door de partijen uit te voeren werkzaamheden op de planning met inbreng van alle noodzakelijke arbeid, vlijt, relaties en know-how.
- b. Alle partijen zeggen toe gevraagd en ongevraagd de nodige gegevens te verschaffen ten behoeve van nader te bepalen detailplanningen om een effectieve en efficiënte onderlinge samenwerking en een adequate voortgangs- en kostenbeheersing mogelijk te maken.
- c. De Coördinerend aannemer is belast met de coördinatie tijdens de uitvoeringsfase en dient zorg te dragen voor de juiste coördinatie van zijn eigen werkzaamheden met die der nevenaannemers, alsmede van de werkzaamheden der nevenaannemers onderling als waren de nevenaannemers onderaannemers van de Coördinerend aannemer.
- d. Alle partijen zijn gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen betreffende hun relevante activiteiten.
- e. Elke partij die moeilijkheden of vertraging ondervindt, doordat een andere partij, zonder aanzien des persoons, op de Uitvoeringsplanning achterblijft ofwel anderszins niet meer werkt, of doordat zich andere belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, is gehouden van die moeilijkheden, vertragingen of belemmeringen en van de oorzaak daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Aannemerscoördinator.
De Aannemerscoördinator belegt in dat geval onmiddellijk een Werkvergadering. In deze Werkvergadering zal getracht worden een zodanige regeling te treffen dat het Project op de meest efficiënte wijze kan worden voortgezet, onverminderd ieders contractuele verplichtingen.
Indien in de Werkvergadering niet tot een oplossing gekomen kan worden van de problemen van de partij die moeilijkheden of vertraging ondervindt, beslist de Aannemerscoördinator en doet hij van dit besluit onverwijld mededeling aan de directie.

PARAGRAAF 3: AANNEMERSCOÖRDINATOR

- a. De Coördinerend aannemer benoemt voor aanvang van de werkzaamheden de Aannemerscoördinator, die hij belast met de dagelijkse leiding over de coördinatie der werkzaamheden als bedoeld in § 31 van de UAV 1989, doch niet dan nadat de opdrachtgever heeft ingestemd met de daartoe, vanwege de Coördinerend aannemer, voorgedragen persoon.
- b. De Coördinerend aannemer vervangt op verzoek van de opdrachtgever de Aannemerscoördinator indien deze onbekwaam danwel ongeschikt is voor de juiste vervulling van zijn taken.

PARAGRAAF 4: COÖRDINATIE

- a. De Aannemerscoördinator stemt de werkzaamheden van de Coördinerend aannemer en van de nevenaannemers op de juiste wijze op elkaar af.
- b. De Coördinerend aannemer en de nevenaannemers verbinden zich ieder jegens de opdrachtgever en jegens elkander om bij de verwezenlijking van het Project zodanig met de Aannemerscoördinator en met elkander te zullen samenwerken en hun werkzaamheden zodanig aan de Uitvoeringsplanning aan te passen, dat de uitvoering van het Project geheel volgens deze planning en binnen de met partijen overeengekomen aannemingsommen zal verlopen.
- c. De dagelijkse leiding over de coördinatiewerkzaamheden van de Coördinerend aannemer berust bij de Aannemerscoördinator.
De Aannemerscoördinator belegt Werkvergaderingen tussen de Coördinerend aannemer en de nevenaannemers.
- d. De Coördinerend aannemer en de nevenaannemers verplichten zich, zich in de in lid 4 bedoelde Werkvergaderingen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde als bedoeld in § 4 van de UAV 1989.
- e. De Aannemerscoördinator is bevoegd om in het belang van een juiste coördinatie namens de Coördinerend aannemer orders en aanwijzingen ter zake van de coördinatie van het Project te geven aan de nevenaannemers.
- f. Indien de werkzaamheden van één of meerdere nevenaannemer(s) zodanig verlopen, dat de geplande termijnen in de Uitvoeringsplanning dreigen te worden overschreden en de betrokken nevenaannemer(s) niet binnen twee weken nadat de Aannemerscoördinator daartoe orders of aanwijzingen heeft gegeven zodanige maatregelen heeft getroffen, dat de werkzaamheden binnen een redelijk te achten termijn overeenkomstig de Uitvoeringsplanning zullen plaatsvinden, is de Aannemerscoördinator na verkregen toestemming van de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het werk of delen daarvan voor rekening en risico van de betrokken nevenaannemer(s) te laten uitvoeren door derden of door personeel van de Coördinerend aannemer.

PARAGRAAF 5: UITVOERINGSPLANNING

- a. De volgorde en tijdsduur van de uit te voeren werkzaamheden van het Project, de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opeenvolgende gedeelten van het Project en de relevante tijdstippen van inzet van materieel en/of leveranties blijken uit de door de Aannemerscoördinator op te stellen en in de Bouwvergadering goed te keuren Uitvoeringsplanning.
In de hiervoor genoemde Uitvoeringsplanning dient tevens een tekeningenschema te zijn opgenomen, waarin aangegeven de voortgang en de uiterste datum van beschikbaarheid van de voor het Project benodigde werktekeningen.

- b. Eventuele lopende de uitvoering van het Project gewenste wijzigingen op de Uitvoeringsplanning worden, met dien verstande dat overeengekomen aannemingssommen en opleverdata dienen te worden gerespecteerd, door de Aannemerscoördinator, na behandeling in de Werkvergadering, aan de Bouwvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

PARAGRAAF 6: OVERIGE BEPALINGEN

Naast het in deze "coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase" bepaalde, blijven de met de afzonderlijke partijen gesloten aannemingsovereenkomsten vastgelegde contractuele verplichtingen onverminderd van toepassing.

Alle door partijen te verrichten activiteiten binnen het kader van deze coördinatie-overeenkomst zijn begrepen in de met de opdrachtgever overeengekomen aannemingssommen.

De Coördinerend aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aanspraken van hemzelf en van nevenaannemers wegens tekortkomingen in zijn coördinatiewerkzaamheden.

(paragraaf 7; indien van toepassing, bijvoorbeeld bij bouwkundige STABU bestekken)

PARAGRAAF 7: COÖRDINEREN BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

Het coördineren van bouwkundige voorzieningen (dit betreft met name sparingen en overige bouwkundige voorzieningen ten behoeve van nevenaannemer(s)) voor het hele Project dient ter goedkeuring van de directie te geschieden door de Coördinerend aannemer.

Hiertoe worden de benodigde bouwkundige tekeningen van de betreffende onderdelen door de Coördinerend aannemer opgestuurd naar de betrokken partijen, die hierop de plaats en afmeting van de voor hun benodigde voorzieningen aangeven.

Plaats en afmeting van in het werk te maken bouwkundige voorzieningen, die niet op de bouwkundige tekening worden aangegeven dienen in het werk door de betreffende partij(en) te worden aangegeven.

Plaats en afmeting van de aangegeven voorzieningen zijn voor verantwoording van de betreffende partij(en).

Bij de uitvoering van bouwkundige voorzieningen dient door de Coördinerend aannemer te worden uitgegaan van de goedkoopste uitvoeringsmethode.

Extra kosten ten gevolge van onvoldoende coördinatie en/of niet optimale uitvoeringsmethode van de hiervoor genoemde voorzieningen zijn voor rekening van de Coördinerend aannemer.

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van deze coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase.

Getekend te,	Handtekening	Datum
1. De opdrachtgever		
2. De		
3. De		
4. De		
5. De		

Bijlage 11
Vrijwaringsverklaring

VRIJWARINGSVERKLARING

Voor het in opdracht van of met toestemming van NS Railinfrabeheer B.V. op spoorwegterreinen (in of nabij de spoorbaan en/of bij EV-hoogspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties) uitvoeren of doen uitvoeren van werken, werkzaamheden of diensten moet ondergetekende een aantal voorwaarden in acht nemen. Ondertekening door de rechtsgeldige vertegenwoordiger bindt zijn bedrijf aan naleving van de hieronder gestelde voorwaarden.

De ondergetekende (naam bedrijf)
(gevestigd te)
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
naam/functie
verklaart aan NS Railinfrabeheer B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Railinfrabeheer, de volgende voorwaarden na te (doen) leven:

1. Het zich begeven en bevinden op spoorwegterreinen met hetgeen daartoe behoort, is onderworpen aan de toestemming van Railinfrabeheer.
2. Railinfrabeheer heeft het recht bepaalde personen niet toe te laten of te verwijderen.
3. De ondergetekende staat er voor in dat voor werkzaamheden op spoorwegterreinen de voorgeschreven werkplekbeveiliging is aangebracht (zie reglement "Veilig werken aan railinfra" en indien van toepassing, het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van EV-Hoogspanningsinstallaties).
4. De ondergetekende is verplicht relevante gegevens van personen die zich na zijn toestemming op spoorwegterreinen kunnen begeven, ter beschikking van Railinfrabeheer te (doen) stellen. Onder deze gegevens wordt o.a. verstaan de opleidings- en keuringseisen zoals genoemd in het Reglement "Veilig werken aan railinfra" en het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van EV-Hoogspanningsinstallaties.
5. De ondergetekende is verplicht medewerkers die 'kritische taken' uitoefenen te voorzien van een geldig Railinfrabeheer-veiligheidspaspoort.
6. De ondergetekende is verplicht de veiligheidspaspoorten onmiddellijk in te (doen) trekken als de houder niet meer bevoegd is de in het paspoort vermelde functie(s) uit te oefenen.
7. De ondergetekende is verplicht alle medewerkers, die zich na zijn toestemming op spoorwegterreinen kunnen begeven, in het bezit te stellen of te doen stellen van een ingevuld en ondertekend bewijs van toegang. De ondergetekende verstrekt alleen een bewijs van toegang aan een medewerker als deze een basisopleiding 'Spoorwegveiligheid' heeft gevolgd.
8. De ondergetekende is verplicht het bewijs van toegang slechts te verstrekken voor de duur van de werkzaamheden, op grond waarvan de betreffende persoon een spoorwegterrein moet betreden.
9. De ondergetekende is verplicht bewijzen van toegang onmiddellijk in te (doen) trekken als de houder zich niet meer op spoorwegterreinen hoeft te begeven.
10. Oneigenlijk gebruik van veiligheidspaspoorten en/of bewijzen van toegang leidt tot uitsluiting van andere opdrachten van Railinfrabeheer.
11. De ondergetekende is verplicht mee te werken aan veiligheidsonderzoeken door Railinfrabeheer, Railned B.V. of andere daartoe bevoegde instanties.
12. Deze verklaring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar, volgend op de dag van het door Railinfrabeheer afgegeven akkoord.

De ondergetekende verklaart, tenzij er met Railinfrabeheer schriftelijk een afwijkende regeling is overeengekomen (bijvoorbeeld bij opdrachten op basis van de ABW 1986, de UAV, de RVOI, etc., waarin aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen), hierbij verder:

- a. N.V. Nederlandse Spoorwegen, haar vennootschappen en haar personeel te ontheffen van alle aansprakelijkheid voor schade die ondergetekende mocht lijden, voor zover deze schade verband houdt met het zich begeven en bevinden op spoorwegterreinen;
- b. N.V. Nederlandse Spoorwegen, haar vennootschappen en haar personeel te vrijwaren voor vorderingen van derden over schade, die verband houden met het zich begeven en bevinden op spoorwegterreinen;
- c. alle schade te zullen vergoeden, niets uitgezonderd, die de N.V. Nederlandse Spoorwegen, haar vennootschappen of haar personeel mocht lijden, voor zover deze schade verband houdt met de in punt a genoemde omstandigheid.

Aldus ondertekend te

de 19..

handtekening functionaris

stempel bedrijf:



In te vullen door NS Railinfrabeheer B.V.

Verklaringsnummer: (op te nemen in hoofdstuk II van het veiligheidspaspoort)

Bedrijfscode: (op te nemen in hoofdstuk IV van het veiligheidspaspoort bij
registratienummer)

Datum akkoord:

Stempel en paraaf NS Railinfrabeheer B.V., afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop:

.....

Bijlage 12
Model controleverklaring

MODEL CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995 inzake besteknr.

Opdrachtgever:

Aannemingssom:

Aannemer:

Subtotaal:

Percentage als bedoeld in artikel 01.03.03 van de Standaard 1995:

besteks- postnr.	korte toelichting	hoeveelheid		afwijking		verre- ken- prijs	+/- bedrag
		bestek	berekening	+/- (abs.)	+/- (%)		

Totaal meer/minder werk ¹⁾ als bedoel in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995
bedraagt f

Van de niet genoemde besteksposten worden de te accorderen hoeveelheden geacht correct te zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995.

Aantal bijlagen stuks.

Verzonden/overlegd aan de directie d.d.

Handtekening aannemer:

Naam:

Ontvangen van de aannemer d.d.

Getekend voor ontvangst:

Getekend voor akkoord:

(Handtekening directie)

(Handtekening opdrachtgever)

Naam: Naam:

¹⁾ Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Bijlage 13
Model akkoordverklaring

MODEL AKKOORDVERKLARING

Akkoordverklaring als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995 inzake besteknr.

Hierbij verklaren

Opdrachtgever:

en

Aannemer:

het hiernavolgende te zijn overeengekomen:

	korte toelichting	hoeveelheid		afwijking		verre- ken- prijs	+/- bedrag
		bestek	berekening	+/- (abs.)	+/- (%)		

Bijkomende afspraken:
.....
.....
.....
.....

Totaal meer/minder werk ¹⁾ als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995
bedraagt f

Van de niet genoemde besteksposten worden de te accorderen hoeveelheden geacht correct te zijn als bedoeld
in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995.

Handtekening aannemer:

Naam:

Handtekening opdrachtgever:

Naam:

¹⁾

Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.


Bijlage 16
Grondbalans

		ontgravingen (m3)				opslag (m3)				aanvullingen (m3)											
Plaats	Grondsoort	hoev. heid		bpn	hoev. heid		bpn	hoev. heid		bpn	hoev. heid		bpn	hoev. heid		bpn	hoev. heid		bpn		
1)Moten 1 t/m 3																					
tunnelmoten																					
	zand	2261	221010		700	226010		1561	225010					640	223010						
	bekledingsgrond	249	221050		115	226020		134	225020					115	223040						
schuifbaan moot 3																					
	zand	135	221040					135	225010												
	bekledingsgrond																				
geluidswal																					
	zand	338	221020					338	225010												
	bekledingsgrond	162	221060					162	225020												
geluidsscherm																					
	zand	5	221030					5	225010												
	bekledingsgrond																				


		ontgravingen (m3)		opslag (m3)				aanvullingen (m3)			
Plaats	Grondsoort			tijdelijk depot		definitief depot		leverantie		uit tijdelijk depot	
		hoev. heid	bpn	hoev. heid	bpn	hoev. heid	bpn	hoev. heid	bpn	hoev. heid	bpn
2) moot 4											
schuifbaan, fase 1											
	zand	317	221110			317	225010				
	bekledingsgrond	63	221130			63	225020				
onder dekplaat, fase 2											
	zand	750	221120			750	225010			60	223020/223030
	bekledingsgrond										
3) moten 5 t/m 8											
tunnelmoten											
	zand	2782	221210	1360	226110	1422	225110			1360	223110
	bekledingsgrond	288	221230	123	226120	165	225120			123	223120
pompput											
	zand	290	221220			290	225110				
	bekledingsgrond										

Samenvatting													
Inhoud ontgravingen in m3								Totaal	Inhoud aanvullingen in m3				Totaal
Grondsoort	deel1	deel 2	deel 3					ontgr. m3	deel 1	deel 2	deel 3		aanv. m3
zand	2739	1067	3072					6878	640	60	1360		2060
bekledingsgrond	411	63	288					762	115	0	123		238
Opslag in tijd. depots								Totaal	Verwerken in def.				Totaal
Grondsoort	en opnieuw verwerken							tijd. opslag	depot				def. depot
	deel 1	deel 2	deel 3					m3	deel 1	deel 2	deel 3		m3
zand	640	60	1360					2060	2099	1007	1712		4818
bekledingsgrond	115	0	123					238	296	63	165		524


Bijlage 17
Montage kopwapening voorgespannen palen

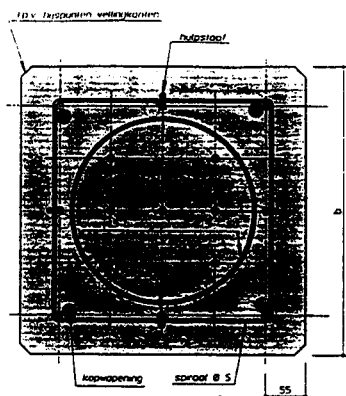


keuze 1

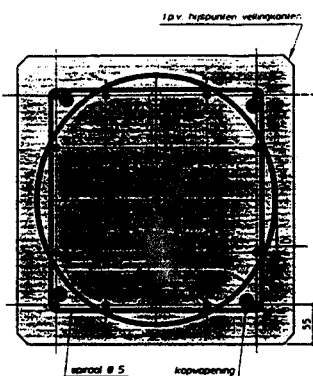


keuze 2

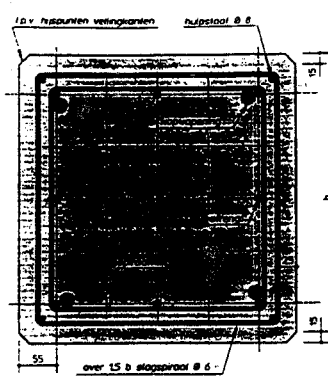

keuze 3

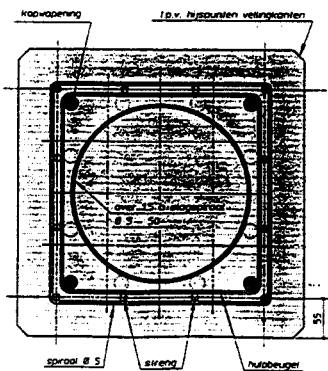

keuze 4

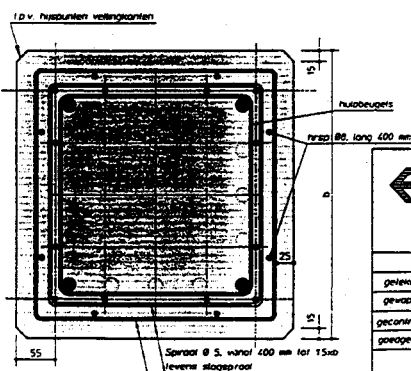

keuze 5

uitgave	gezien	paraaf
datum	gecontroleerd	paraaf
korte beschrijving der wijziging		



Ingenieursbureau Nederlandse Spoorwegen
Bureau Betonbouw

Dealseplein 101 35116X Utrecht tel:030-357451 kamer DK G2.05

naam	paraaf	datum	schaal
geleend	J. Spijker	11-6-92	1:5
gevoerd			1:5
gecontroleerd	G. v. Roekel		1:5
gegevoerd	L. A. v. Hengstum		1:5

Typetekening

formaat	uitgave
A3	

Principe kopwaaiering
voorgespannen palen

tekennummer	421/999 --- 354 P
-------------	-------------------

Bijlage 19
Lijst van door Railinfrabeheer erkende bedrijven

Bijlage 3

RIB AKI

Erkenningssysteem Spooraanneemers

Soort werk	Technische elementen	Categorie
Spoorvernieuwing geelectrificeerd baanvak	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Spoorvernieuwing niet geelectrificeerd baanvak wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Spoorvernieuwing niet geelectrificeerd baanvak niet beveiligd	Spoor	E
Verwisselen spoorstaven geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Verwisselen spoorstaven geelectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Verwisselen spoorstaven niet geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Verwisselen spoorstaven niet geelectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E
Spoorvernieuwing geelectrificeerd emplacement	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Spoorvernieuwing niet geelectrificeerd emplacement niet beveiligd	Spoor	E
Spoorvernieuwing niet geelectrificeerd emplacement wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen ES lassen	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen dwarsliggers spoor wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen dwarsliggers spoor niet beveiligd	Spoor	E
Vervangen overwegen geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Vervangen overwegen geelectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Vervangen overwegen niet geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen overwegen niet geelectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E
Wisselvernieuwing geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Wisselvernieuwing geelectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Wisselvernieuwing niet geelectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Wisselvernieuwing niet geelectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E

Erkende bedrijven Stand per 01-08-99			
Onderneming	Categorie	Contract- waarde	Erkend
1 Ned Rail Spoorwegbouw vof Postbus 9114 1006 AC Amsterdam	E	60	30-10-97
2 Hermann Koehne Bauunternehmung GmbH Postfach 100909 46009 Oberhausen	E	50	30-10-97 (voorlopig)
3a Strukton Railinfra Projecten bv Westkanaaldijk 2 3606 AL Maarssen	E	95	01-03-99
3b Strukton Railinfra Elektrotechniek bv Westkanaaldijk 2 3606 AL Maarssen	A t/m D2	25	01-03-99
4 Volker Stevin Rail & Traffic Contracting bv*** Energieweg 22 4143 Leerdam	E A t/m D2	65 60	15-07-99
5 NBM Rail bv Postbus 834 3300 AV Dordrecht	E A t/m D2	45 35	01-01-97 (voorlopig)
6a Electron Breda bv Postbus 2265 4800 CG Breda	D1	5	01-10-98
6b Electron Amsterdam bv Basisweg 45 1043 AN Amsterdam	D2	5	01-10-98
7 De Wilde Betonboringen bv Postbus 59 2150 AB Nieuw Vennep	E*	1	15-05-98
8 Spoorwerk vof Winthontlaan 28 3526 KV Utrecht	E	90	01-12-98 (voorlopig)
9 HOMIJ Technische Installaties B.V.*** Wattbaan 51 3439 ML Nieuwegein	D1	5	01-03-99
10 BBL railinfra vof Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen	D1, D2 en C E	12 50	01-08-99 (voorlopig)
Verklaring categorieën A: Beheersingssystemen B: Beveiligingssystemen C: Bovenleiding en draagconstructies D1: Tractievoedingen en toebehoren D2: Overige voedingen en toebehoren E: Spoorwerk E*: Directe spoorstaafbevestiging incl. het direct aansluitend spoorwerk Verklaring Contractwaarde (hfl mio) De maximale waarde waarvoor het erkende bedrijf gecontracteerd mag worden. Bij een contract met een doorlooptijd van meerdere jaren is de jaarwaarde bepalend. ***Volker Stevin Rail & Traffic Contracting B.V. en HOMIJ Technische Installaties B.V. behoren tot hetzelfde concern. (Koninklijke Volker Wessels Stevin N. V.). Voor een inschrijving moeten beiden worden uitgenodigd, maar er mag er maar één inschrijven. Onderling moeten zij uitmaken wie inschrijft. Schrijven zij beide in dan worden beide inschrijvingen ongeldig verklaard. Hierover moeten zij op de hoogte worden gebracht in de uitnodigingsbrieven.			

Erkende bedrijven Stand per 01-08-99			
Onderneming	Cluster	Contractwaarde	Erkend
1 Siers Leiding-Montageprojecten Oldenzaal bv Postbus 307 7570 AH Oldenzaal	1, 2, 3 en 5	20	01-10-98
2 Hogenboom Spijkenisse bv Curieweg 9 3208 KJ Spijkenisse	Alle	35	01-10-98
3 Hulsink Ootmarsum Aannemingsbedrijf bv*** Denekamperstraat 45A 7631 AB Ootmarsum	Alle	50	01-10-98
4 De Ruiter Aannemingsmaatschappij bv*** Haarlemmerstraatweg 79 1165 MK Halfweg	Alle	25	01-10-98
5 Aannemingsbedrijf Roelofsen bv Kelvinstraat 4 3846 Harderwijk	Alle	10	01-10-98
6 Gebr. Pol bv Siriusweg 2 8938 BB Leeuwarden	3 en 5	5	01-10-98
7 Kabelwerken Henk Baas bv Kouwe Hoek 4 2741 PX Waddinxveen	1, 2, 3 en 4	15	01-10-98
8 Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken bv Postbus 20 8050 AA Hattem	Alle	20	01-10-98
9 Visser & Smit Hanab bv Postbus 305 3350 AH Papendrecht	Alle	90	01-07-99
10 Heijmans Leidingbouw bv*** Graafsebaan 13 5248 JR Rosmalen	Alle	15	01-12-98
11 Van Helvoirt Kabel- en Leidingwerken bv*** Overbeeke 1 5258 BL Berlicum	1,2,3 en 5	25	01-12-98
12 NBM-Amstelland Bouw & Infra Postbus 60013 6800 JA Arnhem	Alle	110	01-04-99
Verklaring clusters 1. Grondkabels voor laagspanning. 2. Grondkabels voor middenspanning 3. Koperkabel voor informatieoverdracht (inclusief leggen van een buis voor glasvezelkabel) 4. Glasvezelkabel voor informatieoverdracht 5. Coaxkabel voor informatieoverdracht			
Verklaring Contractwaarde (hfl mio) De maximale waarde waarvoor het erkende bedrijf gecontracteerd mag worden. Bij een contract met een doorlooptijd van meerdere jaren is de jaarwaarde bepalend. ***Heijmans Leidingbouw B.V. en Van Helvoirt Kabel- en Leidingwerken B.V. behoren tot hetzelfde concern (Heijmans N.V.). Dit geldt eveneens voor Hulsink Ootmarsum Aannemingsbedrijf B.V. en De Ruiter Aannemingsbedrijf B.V. (Koninklijke BAM Groep N.V.). Voor een inschrijving moeten beide worden uitgenodigd, maar er mag er maar één per concern inschrijven. Onderling moeten zij uitmaken wie inschrijft. Schrijven zij beide in dan worden beide inschrijvingen ongeldig verklaard. Hierover moeten zij op de hoogte worden gebracht in de uitnodigingsbrieven.			

Erkende bureaus Stand per 01-08-99		
Bureau	Categorie	Erkend
1 Arcadis Bouw/Infra B.V. Berkenweg 7 3800 AE Amersfoort	Alle (v)	01-01-99
2 Holland Railconsult B.V. Daalseplein 101 3511 SX Utrecht	Alle (v)	01-01-99
3 Logitech B.V. Princenhofpark 14 3970 AC Driebergen	C (v)	01-07-99

Verklaring categorieën

A: Treinbeveiligingssystemen

B: Tractie energie

C: Spoorwerk en baanbouw

D: Kunstwerken

D1: Betonnen kunstwerken

D2: Stalen bruggen

b: beperkt; v: volledig.

Beperkte erkenning geldt voor diensten, uitsluitend t.b.v. baanvakken en emplacementen die buiten exploitatie zijn en raccordementssporen.

Volledige erkenning geldt zonder beperking.

RIB AKI

Erkennungssysteem Spooraanneemers t.b.v. vernieuwingswerken

Soort werk	Technische elementen	Categorie
Spoorvernieuwing geëlectrificeerd baanvak	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Spoorvernieuwing niet geëlectrificeerd baanvak wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Spoorvernieuwing niet geëlectrificeerd baanvak niet beveiligd	Spoor	E
Verwisselen spoorstaven geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Verwisselen spoorstaven geëlectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Verwisselen spoorstaven niet geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Verwisselen spoorstaven niet geëlectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E
Spoorvernieuwing geëlectrificeerd emplacement	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Spoorvernieuwing niet geëlectrificeerd emplacement niet beveiligd	Spoor	E
Spoorvernieuwing niet geëlectrificeerd emplacement wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen ES lassen	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen dwarsliggers spoor wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen dwarsliggers spoor niet beveiligd	Spoor	E
Vervangen overwegen geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Vervangen overwegen geëlectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Vervangen overwegen niet geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Vervangen overwegen niet geëlectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E
Wisselvernieuwing geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging, bovenleiding en spoor	B, C en E
Wisselvernieuwing geëlectrificeerd niet beveiligd	Bovenleiding en spoor	C en E
Wisselvernieuwing niet geëlectrificeerd wel beveiligd	Beveiliging en spoor	B en E
Wisselvernieuwing niet geëlectrificeerd niet beveiligd	Spoor	E

Bijlage 23
Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van
vrijgegeven technische specificaties

Overzicht van vrijgegeven technische specificaties

Documentnummer	Product	Versie	Datum	Opmerking
SPC00001	Kraagbouten voor dwarsliggers en wisselhout	001	29-07-1998	Deskundige J.Pot afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00002	Kunststof schroefhulzen t.b.v. voorgespannen betonlichaam	002	04-12-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00003	Veerklem SKL 14	001	29-07-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00004	Kurkrubber beddingplaat FC 9 (4,5 mm dik)	001	29-07-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00005	Kunststof opsluitplaten t.b.v. betonnen dwarsliggers	002	04-12-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00006	Volgring Uls 7	001	29-07-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00008	HE profiel opzetpalen voor bovenleiding-draagconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00011	Spoorstaven	001	29-07-1998	Deskundige J.Smulders afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00016	Geconstrueerde palen voor bovenleidingconstructies, typen DLO en SLO	001	23-11-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00017	Armen voor bovenleidingconstructies (type AEL/ADL)	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00019	Y-hangsteunen voor bovenleidingconstructies	001	23-11-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00020	Uithouders voor zijwaartse bevestiging van bovenleidingconstructies	001	23-11-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00021	Afgemonteerde betondwarsliggers NS 90 voor spoorstaafprofiel 54 E1 (oud UIC 54) en voor spoorstaafprofiel 60 E1 (oud UIC 60)	002	03-12-1998	Deskundige F.Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00022	Verzinkte enkelvoudige gietdelen voor bovenleidingconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening

Overzicht van vrijgegeven technische specificaties				
Documentnummer	Product	Versie	Datum	Opmerking
SPC00023	Voorgespannen betonlichaam NS 90	002	04-12-1998	Deskundige F. Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken
SPC00033	Steenlag t.b.v. ballast	002	29-07-1998	Deskundige P. Kootwijk afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken.
SPC00035	Bewerkte strippen en profieldelen voor bovenleidingconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00036	Stalen pijpen en pijpdelen voor bovenleidingconstructies	001	23-11-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00038	Corrosievaste beugelbouten voor bovenleidingconstructies	001	23-11-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00044	Prefab betonnen fundering voor bovenleiding-draagconstructies (V1, V2, F6, F7 en F8)	001	02-12-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00045	Prefab betonnen ankerblok, samenstelling (AN4)	001	02-12-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00046	Prefab betonelement voor ankerblok (AN4)	001	02-12-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00047	Trekplaat voor ankerblok	001	02-12-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00051	Gebogen buisprofielpalen voor bovenleidingdraagconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00052	Rechte buisprofielpalen voor bovenleidingdraagconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00058	RHS draagbalken voor bovenleidingdraagconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00060	Trek- en drukschoren voor bovenleidingconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening

Overzicht van vrijgegeven technische specificaties				
Documentnummer	Product	Versie	Datum	Opmerking
SPC00063	Kolommen voor de bevestiging van de bovenleidingdraagconstructies	001	28-09-1998	Deskundige C. Valkenburg afdeling RIB SO VI energievoorziening
SPC00091	BMvKas kabel 3,6 / 6 (7,2) kV 1x 500/60mm ² Cu	001	10-06-1998	Deskundige R. Blank afdeling RIB SO VI energievoorziening Vervangen door PVE00018
SPC00116	Kurkrubber beddingplaat FC846 (8 mm dik)	001	09-12-1998	Deskundige F. Klösters afdeling RIB SO VI baan en kunstwerken

Bijlage 25
Overzicht bedrijven die beschikken over een
Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)

Bijlage 25

Overzicht van bedrijven met een VVGB

Verwerking van papiergeïsoleerde kabelrestanten

Het volgende overzicht betreft bedrijven met een "Verklaring van geen bedenkingen" (VVGB) van het ministerie van VROM inzake verwerking van papiergeïsoleerde kabelrestanten.

Genoemd overzicht is uitsluitend bedoeld voor verwerking van papiergeïsoleerde kabelrestanten en geldt niet voor verwerking van overige soorten kabelrestanten.

Overzicht per 18 februari 1999

	Bedrijf	Plaats	Vergunning tot:
1	Berger Recycling	Hoogezand	1 juli 2000
2	Europe Metals B.V	Heeze	1 maart 2003
3	Interrec B.V.	Helmond	1 juli 2000
4	PNEM	s-Hertogenbosch	1 december 2001
5	H. Regelink	Kampen	15 oktober 2002
6	SCD	Delft	1 juli 2000
7	SCD	Hoogeveen	1 juli 2000
8	Thijssen	Tilburg	1 juli 2002
9	Van Leeuwen Cable Care	Rotterdam	1 augustus 2003
10	Martens	Elst	15 december 2004

Bestek : Onderdoorgang Campenhoef-Witbrand Tilburg
Besteknummer : Tb 42/3/1
Datum : 5 oktober 1999
