

AANZICHT FASE 1-3

AANZICHT FASE 1-3

Bovenaanzicht

Schaal 1:200

- Situatie vlak voor inschuiven spaarkruisende tunnelmoot.
- Op het bovenaanzicht is het hulpwerk t.b.v. het inschuiven niet getekend.

Fase 1

Schaal 1:200

- Verlagen grondwater.
- Aanbrengen damwanden evenwijdig aan as spoorbaan en t.p.v. de te bouwen pompkelder, inclusief koppelstangen.
- Ontgraven bouwkuip.
- Ontgraven bouwput pompkelder (incl. onderwaterbeton).
- Voorbouwen moot 5 aan noordzijde + bouwen moot 1, 2, 3, 9.
- Proefschuiven over ca. 15m.

Opmerking:
- Hulpwerk t.b.v. het inschuiven is niet getekend.

Fase 2


Schaal 1:200

- Aanvang langdurige buitendienst- en spanningloosstelling.
- Opbreken spoor.
- Ontgraven spoorbaan.
- Aanbrengen schuifbaan t.p.v. het ontgraven baanlichaam.
- Inschuiven spaarkruisende tunnelmoot.
- Aanvullen baanlichaam achter het spaarkruisende tunneldeel.
- Terugbouwen spoor.
- Beëindiging buitendienst- en spanningloosstelling.

Fase 3

Schaal 1:200

- Leegpompen bouwkuip pompkelder en starten vloer + wanden.
- Bouwen moten 4, 6, 7 en 8.
- Aanvullen met grond achter de wanden van de toeritten.
- Gedeeltelijk trekken van de damwanden en verwijderen koppelstangen uit de spoorbaan.
- Afbouwen van de onderdoorgang.
- Beëindiging beëindiging.

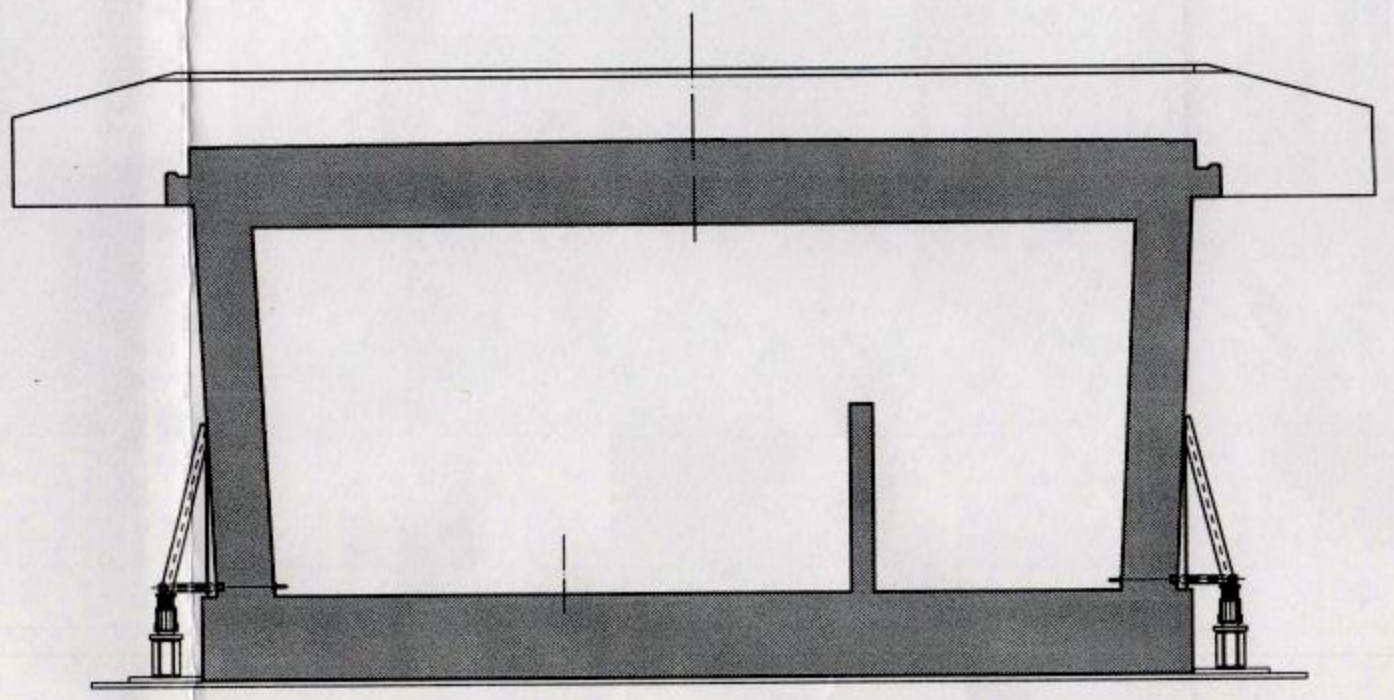

Principe dwarsdoorsnede

Schaal 1:100

Hulpconstructie t.b.v. inschuiven spaarkruisende tunnelmoot.

Revisie conform detail tekeningen

Opmerking:
De op deze tekening weergegeven fasering is ter indicatie.
Een afwijkende bouwvolgorde van de moten t.p.v. de toeritten is mogelijk.

Status: REVISIE d.d. 13-04-2000 09:19:22

naam	por.	status	Bestekstekening Fasering	
getekend V. Winkelaar		25-11-98		
projectleider C.F. Vek				
projectnr. 3362704	versie	1.0		
besteknr. V408K09450			NS Railinfrabeheer Regio Zuid Gilze Rijen Onderdoorgang Europaal	
tekening A0				
schaal div.				
420	123	11.720		713
VA CT PG B2 Postbus 2895 3500 GR Utrecht Telefoon 030 - 235 89 58 Telefax 030 - 235 72 29				
Holland Railconsult				
distributie: /net/0_dwg/chic/123/kw011720/p03362704/roc74/b_3_revisie boecap.ctb 13-04-2000 09:25:04				
